



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

**АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СООБЩЕСТВ
(АРИС)**

**ТРЕТИЙ ПРОЕКТ СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
(ПСИ-3)**

**МИКРОПРОЕКТ «НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ
ПЛОЩАДКИ В С.МЭЭНЕТКЕЧ» БУРАНИНСКОГО АА,
ЧУЙСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Чек-лист Плана управления окружающей и социальной средой
(ПУОСС)**

Чуй- 2020 г

СОДЕРЖАНИЕ

Аббревиатура	2
Часть 1: Общие сведения о проекте и объекте	3
Часть 2: Оценка экологических и социальных воздействий	7
Часть 3: План смягчения негативных воздействий	9
Часть 4: План мониторинга	12
Часть 5. Информация о МОС и механизм рассмотрение жалоб	15
Приложение 1. Разбивочный чертеж	16
Приложение 2. Место расположение участка и прилегающих объектов	18
Приложение 3. Контрольный список социального скрининга для оценки последствий и социальных рисков:	19
Приложение 4. Образец баннера	21

Аббревиатура

АО	Айыльный округ
АРИС	Агентство развития и инвестирования сообществ
АСМ	Асбестосодержащие материалы
ВБ	Всемирный Банк
ГАООСЛХ	Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики
ГЭТИ	Государственная экологическая и техническая инспекция при Правительстве Кыргызской Республики
МРС	Мелкий рогатый скот
ПУОС	План управления окружающей среды
СЭН	Санитарно-эпидемиологический надзор
ТУ	Технические условия
АПУ	Архитектурно-планировочные условия

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ И ОБЪЕКТЕ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ				
Организационные условия (Имена и контакты)	Руководство проекта Координатор ПСИ-3 АРИС М.Э.Баялиев ТЕЛ: 0312 30-01-50-217		Местная сторона и/ или получатель Глава айыл окмоту Комурчиев Нурлан Сагынбекович 0705 681 636	
Механизмы реализации (Имена и контакты)	Надзор за мерами экологической безопасности Консультант по мерам безопасности АРИС Канджебаев Т. 0555667466	Надзор за работами местного подрядчика С.Абдыкадыров Областной инженер АРИС Тел: 0557 849 584	Надзор за работой местных инспекций Инженер технического надзора ГЭТИ Турдумамбетов Руслан Майрамбекович 0707178040	Подрядчик Определится по результатам тендера
ОПИСАНИЕ УЧАСТКА РАБОТ				
Название объекта	Село Мээнеткеч ул. Маласы б/н в районе школы. Координаты Google Earth E42°46'38,26 N75°18'14,86			
Кто владеет землей?	Буураинский АА			
Описание проектных работ	<p>Детская площадка будет расположена в с. Мээнеткеч. Участок прямоугольной формы 25x40 м. 10 соток. В нем предусматривается прогулочная дорожка из брусчатки и зона отдыха, установка качелей, горки, песочницы, а также турники и брусья. (см. рисунок на стр. __)</p> <p>В рамках микропроекта планируется закупка оборудования и монтаж детского оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Беседка- 1 шт; – Качеля – 1шт; – Горка – 2 шт для старшей и младшей группы; – Карусель – 1 шт. – Ограждение 80 м – Искусственный газон 600 м² – Монтаж беседки – Монтаж качели – Монтаж горки – Устройство песочницы – Устройство домика – Монтаж карусели 			

	<ul style="list-style-type: none"> – Монтаж детского турника – Монтаж скамейки – Монтаж детской скамейки – Маленькая площадка 24 м² – Освещение площадки – Устройство цветника
<p>Описание вопросов географического, физического, биологического, геологического, экологического и социально-экономического характера</p>	<p>Район строительства относится к 4 климатическому району; Сейсмичность площадки строительства составляет 9 баллов; Высота над уровнем моря 921 м. Глубина залегания грунтовых вод около 10 метров.</p> <p>Климатические особенности района характеризуются климатическими показателями для восточной части области. Климат континентальный с сухим жарким летом, с умеренно холодной зимой. Средняя температура июля 25⁰С. Осень сухая, теплая с резким переходом к зиме. Снежный покров непостоянный. Количество дней в году со снежным покровом 52, усреднённая высота снежного покрова 16 см в интервале высот 0,8-1,3 км.</p> <p>Количество атмосферных осадков в пределах 400 мм в год с постепенным увеличением до 500-600 мм в год в направлении гребневой части Кыргызского хребта.</p> <p>Для северного склона Кыргызского хребта снегонакопление происходит неравномерно и зависит от высоты. И выражается следующим образом: 1000 м – 15 см высота снежного покрова – 68 число дней в году со снежным покровом.</p> <p>Гидрографическая сеть района представлена как естественными водотоками, так и искусственными. Из естественных водотоков наиболее крупными являются левые притоки р. Чу. Расходом 1% обеспеченности характеризуются следующие реки: р. Кызыл-Суу – 15,6 м³/с; р. Карагул – 13,9 м³/с; р. Шамшы (в районе с. Кошой) – 55,4 м³/с; р. Талды-Булак – 15,2 м³/с; р. Бурана – 23,5 м³/с, р. Арпа-Тектир – 16,3 м³/с, р. Кегети – 31,5 м³/с. Питание рек ледниково-снеговое с периодом максимальных паводков в июле-августе месяцах.</p> <p>На территории Буранинского айыльного аймака имеется исторический комплекс «Башня Бурана» между селами Дон-Арык и Бурана на расстоянии около 1 км от одного и второго из сел. Там же с Юга на Север проходит русло реки «Бурана». Вода в русле реки протекает только в весенне-летний период. (расстояние от планируемого строительства с.Мээнеткеч – около 5 км). С южной стороны АА с Востока на Запад проходит Большой чуйский канал (БЧК), по руслу которого</p>

проходит административная граница Буранинского АА с соседними Кегетинским и Ибраимовским АА., (от с.Мээнеткеч БЧК на расстоянии 2,5 км).

Планируемый участок находится рядом с территорией школы.

В непосредственной близости с планируемым участком имеется Монумент воинам ВОВ, памятник имеет статус местного значения (см. стр. 20).

Рельеф участка: ровный. На участке прежде не было селей, оползней, нет признаков эрозии почвы.

Поверхность земли: грунт. Проектные работы не окажут влияния на ландшафт.

Растительный покров: Деревьев и насаждений не имеется.

Наличие асбестосодержащих материалов (АСМ): Отсутствует

Вопросы переселения: Применение политики ВБ 4.12 «Вынужденное переселение» не требуется.

В Буранинский АА входят четыре села Дон-Арык, Бурана, Алга, Мээнеткеч.

Национальный состав села Мээнеткеч

Кыргызы – 1196 чел., узбеки-7 чел., русские-4 чел., дунгане -1., казахи-1чел., азербайджанцы-6 чел., украинцы-1чел.

Количество жителей 1216 чел., из них женщин - 578 , мужчин-638, детей дошкольного 142 и школьного возраста -184 чел.

Количество детей ЛОВЗ до 18 лет – всего 40 детей, в том числе:

с.Дон-Арык	с.Бурана	с.Алга	с.Мээнеткеч
24	3	6	7

На территории Буранинского АА больниц не имеется.

	с.Дон-Арык	с.Бурана	с.Алга	с.Мээнеткеч
СШ	есть	Нет	нет	есть
Кол-во учеников	487	-	-	182
ФАП	есть	Нет	есть	есть
Кол-во обслуж. персонала	30	-	20	20
Детсады	Есть (при школе)	Нет	нет	В конце декабря т.г. введен в эксплуатацию детсад на 70 детей
Кол-во детей	80	-	-	Набор детей только идет.

Наличие водоснабжения в селах (водопровод).

с.Дон-Арык	с.Бурана	с.Алга	с.Мээнеткеч
есть	есть	есть	есть

Канализации на территории АА не имеется.

Наличие газопровода в селах – нет.

Основной доход местных жителей

Кол-во работающих в: АО – 21 чел.; ФАП-4 чел; Школа – 55 чел.

с.Дон-Арык	с.Бурана	с.Алга	с.Мээнеткеч
Работающие 2620 (м-1650, ж-970)	Работающие 345 (м-185, ж-160)	Работающие 225 (м-145, ж-80)	Работающие 978 (м-618, ж-360)
В том числе: 58 чел. в АО, ФАП и Школа. Остальные на предприятиях и организациях г.Токмок и Чуйского района.	В том числе: 1 чел. в АО. Остальные на предприятиях и организациях г.Токмок и Чуйского района.	В том числе: 2 чел. в АО и ФАП. Остальные на предприятиях и организациях г.Токмок и Чуйского района.	В том числе: 19 чел. в АО, ФАП и Школа. Остальные на предприятиях и организациях г.Токмок и Чуйского района.
Безработные 365 (м-170, ж-195)	Безработные 121 (м-50, ж-71)	Безработные 97 (м-53, ж-44)	Безработные 80 (м-40, ж-40)
Кол-во семей имеющий зем.надел - 540	Кол-во семей имеющий зем.надел - 97	Кол-во семей имеющий зем.надел - 70	Кол-во семей имеющий зем.надел - 101

Ближайшая станция – «ст.Токмок».

с.Дон-Арык	с.Бурана	с.Алга	с.Мээнеткеч
13 км	11 км	9км	7 км

До города Токмок сколько км?

с.Дон-Арык	с.Бурана	с.Алга	с.Мээнеткеч
14 км	12 км	10км	8 км

Месторасположение и расстояние от пункта материального снабжения, инертных материалов и воды	Из ближайших строительных рынков и официальных карьеров Из водопроводной сети
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Национальное законодательство и разрешения, которые применяются к проектной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Закон КР об охране окружающей среды (2016) • Закон КР об экологической экспертизе (2015) • Закон КР Общий технический регламент по экологической безопасности в КР (2012) • Закон КР об отходах производства и потребления (2001) <p>Подрядчик ответственен за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • получение разрешения на проведение строительных работ от территориального районного управления по градостроительству и архитектуре; • заключение договора с АО на размещение строительного мусора на свалке АО.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ	
Укажите, где и когда проходили встречи в процессе консультаций с общественностью	Консультации с общественностью проходили во время выбора приоритетных объектов в отборочный тур для участия во втором отборочном цикле ПСИ-3.
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА	
Ожидается ли развитие потенциала?	[] Нет или [X] Да. Проведены обучения (тренингов) по теме: «Совместная оценка нужд села», «Разработка стратегий развития местных территорий», «Разработка проектных предложений», «Развития потенциала сообществ: правовые основы МСУ».

ЧАСТЬ 2: ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

	Виды работ и примеры возможных воздействий	Состояние – в случае ответа «да» по пункту	Дополнительные ссылки
Могут ли намеченные работы на участке вызвать прямо	1. Реконструкция/восстановление <ul style="list-style-type: none"> • Нагрузки в связи с движением транспорта на участке • Повышенные уровни шума, пыли, загрязнение воды и почвы при работах по сносу и/или восстановлению объекта • Строительный и бытовой мусор 	[] Да [x] Нет	См. ниже пункты А и В

	Виды работ и примеры возможных воздействий	Состояние – в случае ответа «да» по пункту	Дополнительные ссылки
или косвенно какие-то из следующих проблем и/ или воздействий:	2. Новое строительство <ul style="list-style-type: none"> • Последствия землеройных работ и эрозия почвы • Сточные воды в местные водотоки и подземные водные горизонты • Нагрузки в связи с движением транспорта на участке • Повышенные уровни шума и пыли при строительстве • Строительный мусор 	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	См. ниже пункты А и В
	3. Охрана труда и техника безопасности для рабочих во время строительства	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	См. ниже пункты А
	4. Обеспечение безопасности движения и пешеходов <ul style="list-style-type: none"> • Участок расположен в населенном пункте 	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	См. ниже пункты D
	5. Усовершенствование проекта зданий для улучшенного рационального использования воды и энергии	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	См. ниже пункты F и H
	6. Канализация и очистка сточных вод <ul style="list-style-type: none"> • Сточная система отвода и/ или прямой сброс сточных вод в местные водотоки 	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	См. ниже пункты L
	7. Исторические здания и участки <ul style="list-style-type: none"> • Нарушение памятников историко-культурного наследия (ИКН) 	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	См. ниже пункты К
	8. Получение земли под проект ¹ <ul style="list-style-type: none"> • Использование территории частной собственности • Временное переселение местного населения в связи с работами по проекту • Меры вынужденного переселения • Воздействия на доходы/ средства жизни местного населения и коммерческие структуры 	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	См. ниже пункты M
	9. Опасные или токсичные материалы ² <ul style="list-style-type: none"> • Вывоз или утилизация токсичных и/ или опасных отходов строительных работ или работ по сносу объектов 	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	См. ниже пункты С
	10. Воздействия на леса и/ или иные охраняемые территории <ul style="list-style-type: none"> • Воздействие на территорию охраняемых лесных насаждений, в буферные и/ или иные 	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	См. ниже пункты I

¹ Получение земли (землеотвод) под проектные работы включает в себя переселение местного населения; изменения в средствах жизни местного населения; вторжение в пределы территорий, находящихся в частной собственности. Это касается участков земли, которые приобретаются или передаются под проект, и таковые приобретения или передачи земли связаны с воздействием на людей, которые проживают официально и/ или неофициально на этой земле и/ или занимаются на ней каким-то бизнесом (к примеру, держат киоски).

² К работам с токсическими и/ или опасными материалами относятся, в частности, работы с асбестом, ядовитыми красками, работы по снятию красок с содержанием свинца и пр.

	Виды работ и примеры возможных воздействий	Состояние – в случае ответа «да» по пункту	Дополнительные ссылки
	охранные зоны <ul style="list-style-type: none"> • Беспокойство для местной естественной среды обитания охраняемых животных 		
	11.Обращение с медицинскими отходами и их утилизация <ul style="list-style-type: none"> • Утилизация медицинских отходов на участке или за его пределами 	[] Да [X] Нет	См. ниже пункт J

6 Токсичные и вредные материалы включают, но не ограничены асбестом, токсичными красками, ядовитыми растворителями, удалением краски на основе тетраэтилсвинца и т.д.

ЧАСТЬ 3: ПЛАН СМЯГЧЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Деятельность	Параметры	Проверочный список мер смягчения воздействий
А. Общие условия работ	Оповещение, инструктаж и обеспечение безопасности работников	<ul style="list-style-type: none"> (a) Местные инспекции, контролирующие строительные работы и экологическую безопасность, а также местные жители должным образом извещены о предстоящих проектных работах. (b) Местная общественность должным образом извещена о работах с помощью вывесок в местах общего доступа (и в том числе на участке работ). (c) Размещение информационного баннера на участке работ. (d) Установлены надлежащие ограждения вокруг строительного участка для гарантии безопасности населения и детей. (e) Получены требуемые законодательством разрешения (использование природных ресурсов, свалку отходов и др.) на производство строительных работ. (f) Все работы должны выполняться самым безопасным и дисциплинированным образом и быть организованы так, чтобы свести к минимуму негативные воздействия производственного процесса на местных жителей и природную среду. (g) На участке должны размещаться надлежащие указательные и информационные таблички, информирующие рабочих об основных правилах и нормах ведения работ, которые необходимо выполнять. (h) Если Подрядчик привлечет к ремонтно-строительным работам приезжий персонал, который будет находиться на объекте постоянно, то для него должны быть созданы все необходимые бытовые условия, включая помещения для ночлега и для приема пищи, душевые, туалет, а также организовано питание. (i) Наличие на участке работ аптечек первой медицинской помощи (j) Средства индивидуальные защиты работников должны отвечать стандартам безопасности работ (с

Деятельность	Параметры	Проверочный список мер смягчения воздействий
		<p>обязательным постоянным ношением касок, защитных масок в тех условиях, где это необходимо, защитных очков, страховочных ремней безопасности и защитной обуви).</p> <p>(k) Выполнение работ в соответствии со СНиП КР 12-01-18 Безопасность труда в строительстве</p> <p>(l) наличие на рабочем месте журналов инструктажей по технике безопасности</p> <p>(m) наличие на стройплощадке списка служб экстренной помощи и их ближайшее расположение, телефоны.</p>
В. Общие строительные работы	Качество воздуха	<p>(a) Строительный мусор должен накапливаться в отведенном месте с последующим вывозом на свалку.</p> <p>(b) Соблюдать чистоту на строительной площадке и прилегающей территории.</p> <p>(c) Запрещено сжигать строительные отходы и конструкции на открытом огне на строительной площадке.</p> <p>(d) Не допускать избыточного скопления неработающей строительной техники на строительной площадке.</p> <p>(e) Не допускать работы двигателей техники на холостом ходу</p> <p>(f) Снижать уровень пыли от работы или транспортировке материалов до минимальных значений за счет поливов подъездных путей</p> <p>(g) Уменьшать количество погрузок грунта в автомобили.</p> <p>(h) Организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных материалов, растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты) и пр.</p> <p>(i) Оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, съемными тентами</p>
	Почва	<p>(a) Заправка автомобилей строго на стационарных постах</p> <p>(b) Не допускать загрязнение территории строительства проливами ГСМ с целью предотвращения попадания в почву.</p> <p>(c) Снятие плодородного слоя почвы для использования в рекультивационных работах</p> <p>(d) Предусмотреть дренажные мероприятия для предотвращения подтоплений почвы при высоком уровне грунтовых вод</p> <p>(e) Территория стоянки строй техники покрывать щебнем</p>
	Шум	<p>(a) Строительные шумы допускаются только в установленные периоды времени с 8:00 до 18:00.</p> <p>(b) Во время работ, кожухи и капоты на двигателях генераторов, воздушных компрессоров и прочих машин и механических устройств должны быть надеты и закрыты, а сами эти машины и механизмы должны размещаться как можно дальше от жилой застройки.</p>
	Качество воды	<p>(a) Не допускать загрязнение территории строительства проливами ГСМ с целью предотвращения попадания загрязненных стоков в арычную сеть.</p>
	Работа с отходами	<p>(a) Для строительного мусора, подготовить места его временного складирования с последующим вывозом на местную свалку.</p> <p>(b) При возможности, подрядчик обеспечивает вторичное использование соответствующих применимых и</p>

Деятельность	Параметры	Проверочный список мер смягчения воздействий
		<p>стойких материалов (за исключением АСМ).</p> <p>(с) Бытовые и пищевые отходы от постоянного нахождения на объекте приезжего персонала Подрядчика должны быть отделены от остальных отходов строительной деятельности и помещаться в специальные контейнеры, которые по мере заполнения должны вывозиться на районную свалку.</p>
<p>Д. Безопасность движения транспорта и пешеходов</p>	<p>Прямые или косвенные опасности для движения транспорта и пешеходов при строительстве</p>	<p>(а) Подрядчик должен обеспечить надлежащую охрану строительного участка.</p> <p>(б) Оснастить участок работ информационными и предупредительными табличками, ограждениями для того, чтобы участок работ был обозначен и виден, а общественность была должным образом оповещена и предупреждена о возможных опасностях.</p> <p>(д) Следует обеспечивать безопасный и постоянный доступ в существующее здание ФАП во время строительных работ на объекте, если существующий ФАП останется открытым для посещения людей</p>

ЧАСТЬ 4: ПЛАН МОНИТОРИНГА

Фаза	Что (есть ли необходимость контроля параметра?)	Где (есть ли необходимость контроля параметра?)	Как (есть ли необходимость контроля параметра?)	Когда (укажите частоту проверок и их продолжительность)	Почему (есть ли необходимость контроля параметра?)	Затраты (если он не заложен в бюджет проекта)	Кто (отвечает за мониторинг?)
Проектирование	Проектно-сметная документация (ПСД) детально описана в пункте Е выше.	Отчеты и готовая ПСД, подготовленные проектной компанией.	Обзор отчетов и готовой ПСД, подготовленных проектной компанией.	На стадиях представления проектной компанией готовой ПСД перед экспертизой.	Для обеспечения включения всех необходимых требований в тендерную документацию.	За счет бюджета Проекта	АРИС

Фаза	Что (есть ли необходимость контроля параметра?)	Где (есть ли необходимость контроля параметра?)	Как (есть ли необходимость контроля параметра?)	Когда (укажите частоту проверок и их продолжительность)	Почему (есть ли необходимость контроля параметра?)	Затраты (если он не заложен в бюджет проекта)	Кто (отвечает за мониторинг?)
Строительные работы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ограждение территории участка во время строительных работ. 2. Наличие информационных стендов с указанием контактных данных для жалоб местного населения. 3. Наличие индивидуальных средств защиты персонала Подрядчика. 4. Запрет на использование АСМ. 5. Предотвращение эрозии почвы и попадания сточных вод в прилегающие водотоки. 6. Надлежащий сбор и вывоз строительного мусора. 7. Наличие у Подрядчика договора с айыл окмоту на размещение строительного мусора на местной свалке. 8. Предотвращение образования пыли. 9. Снижение и ограничение во времени (с 8:00 до 18:00) шума. 	Участок строительных работ.	<p>Инспекционные визиты на участки строительных работ.</p> <p>Обращения с жалобами со стороны местного населения.</p>	<p>В течение строительства и до выдачи Свидетельства о завершении работ.</p> <p>В случае обращения с жалобами со стороны местного населения.</p>	Для обеспечения соблюдения всех необходимых экологических требований.	Должны быть включены Подрядчиком в тендерное предложение	ГЭТИ. СЭН.
Эксплуатация	1. Надлежащая эксплуатация игровой площадки. Подрядчик представляет инструкцию об эксплуатации		Наблюдение.	Еженедельно	В связи с требованиями	За счет средств, АО.	АО

Фаза	Что (есть ли необходимость контроля параметра?)	Где (есть ли необходимость контроля параметра?)	Как (есть ли необходимость контроля параметра?)	Когда (укажите частоту проверок и их продолжительность)	Почему (есть ли необходимость контроля параметра?)	Затраты (если он не заложен в бюджет проекта)	Кто (отвечает за мониторинг?)
	оборудования.		Эксплуатирующая организация	Периодически согласно служебным инструкциям.	национальных норм и стандартов		ГЭТИ, СЭН.

ЧАСТЬ 5. ИНФОРМАЦИЯ О МОС И МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

По всем вопросам относительно реализации ПСИ-3 любые заинтересованные лица проекта могут обратиться в МОС АРИС и имеют следующие права:

- Право на получение информации;
- Право на противодействие нецелесообразному вмешательству со стороны третьих лиц;
- Право на участие в тендерном процессе без случаев мошенничества и коррупции.

Любое заинтересованное лицо проекта ПСИ-3 (включая жителей села, подрядчиков, сотрудников проекта, органов власти и других вовлеченных сторон) могут подать жалобу, если он/она считает, что одно или несколько из выше представленных прав, либо какой-либо из проектных принципов или процедур было нарушено.

Жалобы подлежат публичному разглашению, но личность лица, подающего жалобу, остается конфиденциальной, только если лицо не решит раскрыть свою личность. Личность всех, подающих жалобы, обеспечивается конфиденциальностью.

Механизм рассмотрения жалоб

Регистрация обращения. *Обращения, полученные в письменном, устном или электронном виде, регистрируются в журнале МОС, а затем вносятся в конфигурацию МОС для анализа и мониторинга входящей корреспонденции, содержащей следующую информацию (в зависимости от вида обращения):*

- Фамилия, имя, отчество;
- Адрес регистрации и проживания или номер телефона;
- Содержание обращения;
- Другая справочная информация.

Обращения могут быть поданы анонимно. В случае, если обращения поступило при отсутствии каких-либо вышеперечисленных данных, оно фиксируется в журнале входящей корреспонденции МОС, а результаты обращения будут опубликованы в СМИ на местном уровне, на сайте АРИС либо обнародованы на сессии Айыльных Кенешей.

Контроль исполнения. После завершения расследования, бенефициар получит уведомление о решении, принятом АРИС по его делу. В случае, если гражданин/бенефициар не удовлетворен решением, полученным по результатам рассмотрения обращения, он имеет право на апелляцию. Инструкции по подаче апелляции будут предоставлены вместе с ответом.


Апелляция. Апелляция рассматривается специальным Комитетом АРИС по рассмотрению обращений. Исполнительный директор АРИС сформирует Комитет по рассмотрению обращений из руководителей проектов и руководителей отделов, которые будут проводить слушание апелляций. После апелляционного рассмотрения обращения, гражданин/бенефициар неудовлетворенный решением Комитета, имеет право на обжалование решения в судебном порядке.

Публикация обращений. После того, как обращение (заявления, предложения, жалобы, запросы, позитивные отзывы) разрешено, для поощрения использования МОС, меры, предпринятые для ее разрешения, будут опубликованы в средствах массовой информации на местном уровне. По желанию личность заявителя будет сохранена в тайне.

Каналы обратной связи. В рамках ПСИ-3 АРИС установлены следующие каналы связи, посредством которых жители/бенефициары могут направить обращения на разных этапах реализации проекта:

- a. WhatsApp (система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных устройств с поддержкой голосовой и видеосвязи – номера МОС + 996 550 700 522; +996 770 700 522);
- b. Социальные сети (Фейсбук – Официальная страница «Агентства развития и инвестирования сообществ»);
- c. Веб-сайт АРИС: www.aris.kg;
- d. Устные или письменные обращения, полученные в ходе рабочих встреч на местах, фасилитаторов, молодежных кураторов и/или ЭПРО;
- e. Входящая корреспонденция нарочно в приемную АРИС;
Входящая корреспонденция по электронной почте bfm@aris.kg

Разбивочный чертеж М 1:500

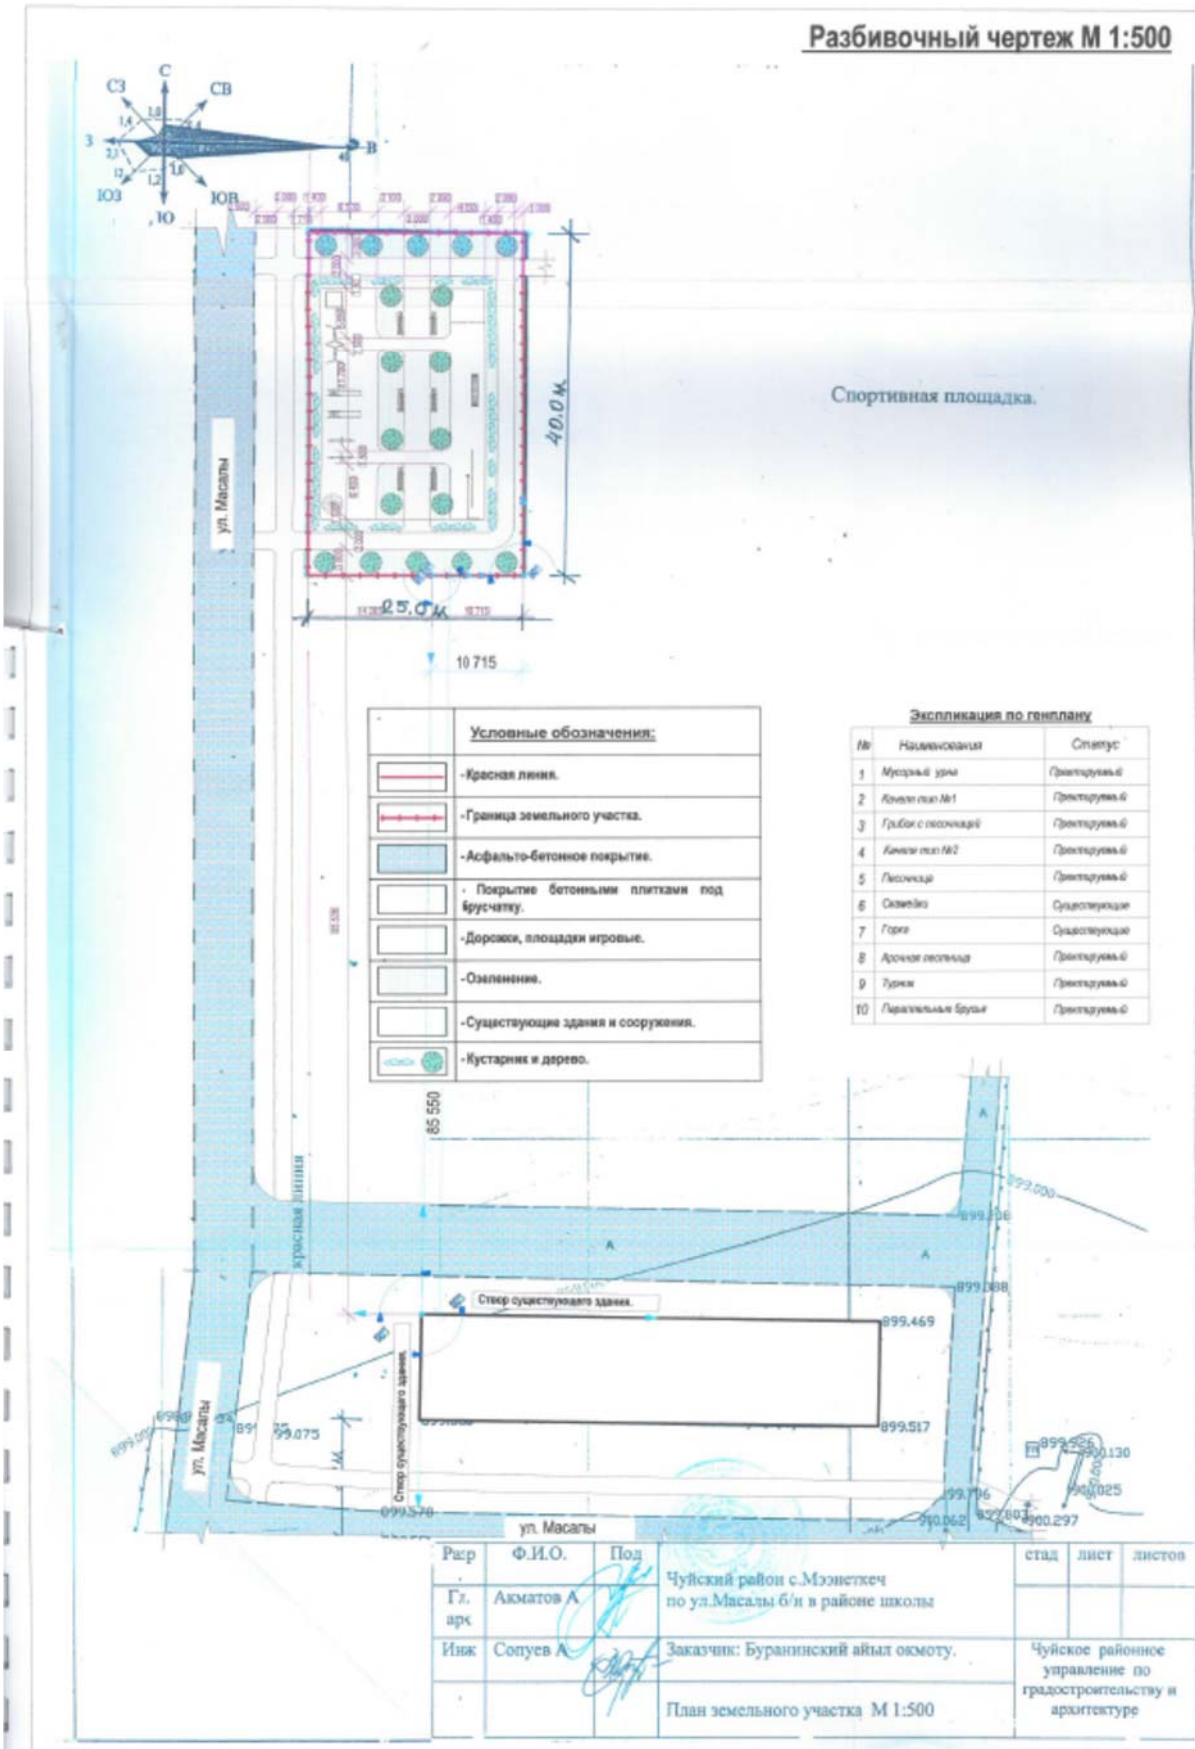

Общий вид проектируемой площадки



					Детская игровая площадка, Малые архитектурные формы. Чуйский район, с.Мазантлеп ул. Масалы 6/н в районе школы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Заказчик: Дюкдубаев У.Т.	Стадия	Лист	Листов
						РП	АР-24	
Разраб. Токтоганов А.					Общий вид	ООО "Арсфера"		



					Детская игровая площадка, Малые архитектурные формы. Чуйский район, с.Мазантлеп ул. Масалы 6/н в районе школы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Заказчик: Дюкдубаев У.Т.	Стадия	Лист	Листов
						РП	АР-22	
Разраб. Токтоганов А.					Общий вид	ООО "Арсфера"		

Приложение 2. Место расположение участка и прилегающих объектов



Приложение 3. Контрольный список социального скрининга для оценки последствий и социальных рисков:

Название микропроекта: Новое строительство детской площадки

Область: Чуйская

Район: Чуйский

Айыльный аймак: Буранинский

Село: Мээнеткеч

	Возможное недобровольное переселение / социальные последствия (воздействие)	Да	Нет	Не известно	Подробности
1.	Будет ли деятельность проекта включать новые строительные физические работы?	x			
2.	Включает ли деятельность проекта модернизацию или реабилитацию существующих физических объектов?		x		
3.	Может ли деятельность проекта привести к потере жилья, других активов или нанести непоправимый ущерб использованию ресурсов?		x		
4.	Является ли участок, отведенный для данной работы, свободным от обременений и находится ли он в общественной/государственной/поселковой собственности?	x			Проектируемый участок строительства находится в муниципальной собственности. В соответствии с государственным актом на земельный участок.
5.	Требуется ли деятельность проекта в данном микропроекте необходимость приобретения частного земельного участка?		x		
6.	Если участок находится в частной собственности, можно ли приобрести эту землю путем согласованного урегулирования? (Желающий покупатель - желающий продавец)		x		
7.	Если земельный участок должен быть приобретен, известна ли фактическая площадь участка и статус собственности?				Участок находится в муниципальной собственности
8.	Готовы ли эти владельцы земельного участка добровольно пожертвовать требуемый земельный участок для данного подпроекта/микропроекта?				Не требуется
9.	Могут ли затронутые подпроектом/микропроектом землевладельцы лишиться более 10% своей земли/строения в результате пожертвований?		x		
10.	Имеется ли площадь для мобилизации материалов или транспорта для строительных работ в пределах существующего участка / полосы отвода?	x			
11.	Есть ли какие-либо люди, не оформившие право собственности, но живут /занимаются бизнесом на предлагаемом участке/местах осуществления проектов, которые используют для строительных работ?		x		
12.	Возможно ли какое-либо временное воздействие?		x		
13.	Есть ли возможность выселиться, закрыть деятельность в области бизнеса/коммерции или деятельность людей по обеспечению средств к существованию во время строительства?		x		

14.	Есть ли физическое перемещение людей из-за строительства?		х		
15.	Включает ли данный проект переселение каких-либо лиц? Если да, опишите подробно.		х		
16.	Будет ли потеря/ ущерб сельскохозяйственных (-м) земель (-ям), необранного (-му) урожая (-ю), деревьев (-ям)?		х		
17.	Будет ли потеря дохода и средств к существованию?		х		
18.	Потеряют ли люди навсегда или временно доступ к объектам, услугам или природным ресурсам?		х		
19.	Станет ли проект причиной потери работы / рабочих мест?		х		
20.	Будет ли проект способствовать/ приведет к чрезмерному притоку рабочей силы в результате новых сооружений?		х		
21.	Требуют ли строительные работы дополнительной/ квалифицированной рабочей силы за пределами населенного пункта?		х		Разнорабочие на строительные работы будут привлекаться в данном населенном пункте.
22.	Будет (-ут) ли строительные работы вызывать разрушение/нарушение жизнедеятельности принимающего сообщества?		Х		
23.	Будет ли строительство новых зданий, линий дренажа создавать любое разрушения для соседних домов, колодцев, земель?		Х		
24.	Будет ли данное вмешательство создавать какие-либо межгрупповые или внутригрупповые напряжения /конфликты?		Х		Для строительства данного объекта не будут наниматься международные подрядчики.
25.	Есть ли какие-либо уязвимые группы (в том числе коренные народы, проживающие в предлагаемых местах или затронутые вмешательством вследствие осуществления проекта)?		х		
<p>Общая оценка и предлагаемые меры по смягчению последствий, если таковые имеются: Данный микропроект имеет очень низкий риск социального воздействия В данном подпроекте ОР ВБ 4.12 не применяется.</p>					

Приложение 4. Образец баннера

1000мм



THE WORLD BANK

**Агентство развития и инвестирования сообществ
Кыргызской Республики
Проект сельских инвестиций -3**

Наименование подпроекта/ микропроекта: « _____ »

Заказчик: **Айыльный аймак**

Подрядчик:

Начало строительства : « _____ » 2019 г. Окончание строительства: « _____ » 20__ г.

По всем вопросам о ходе реализации Проекта обращаться по следующим тел. МОС АРИС:
+ 996 (770) 700-522 (WhatsApp), + 996 (550) 700-522 (моб.)
Ответственный за реализацию:

500 мм
