



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
(АРИС)

ТРЕТИЙ ПРОЕКТ СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
(ПСИ 3)

**Микро-проект: «Частичный ремонт системы водоснабжения в селе
Первомай, Первомайского АА, Сокулукского района Чуйской
области»**

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
СРЕДОЙ
(ПУОСС)

Первомай - 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение	4
2. Общая информация о районе и айыл окмоту	4
3. Основные планируемые работы	8
4. Минимизация социальных рисков	10
5. Объем и цели ПУОСС	10
6. Экологическое законодательство	11
7. План мероприятий по охране окружающей среды	13
8. ПЛАН МОНИТОРИНГА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	19
9. ИНФОРМАЦИЯ О МОС И МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ	21
Приложение 1. Протокол общественных слушаний	22
Приложение 2. Список участников общественных слушаний	24
Приложение 3. Фото отчет по проведению общественных слушаний в с. Первомай	27
Приложение 4. Чек-лист оценки социальных рисков и воздействий	28

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АА	Айыльный аймак
АРИС	Агентство развития и инвестирования сообществ
ВБ	Всемирный банк
ГСМ	Горюче-смазочные материалы
ГЭТИ	Государственная экологическая и техническая инспекция
КР	Кыргызская Республика
МВД	Министерство внутренних дел
ОМСУ	Органы местного самоуправления
ОР	Операционное руководство
ОП	Операционная политика
ПРС	Почвенно-растительный слой
ПСД	Проектно-сметная документация
ПСИ	Проект сельских инвестиций
ПМ	План мониторинга
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой
СИЗ	Средства индивидуальной защиты

1 Введение

Проект сельских инвестиций (ПСИЗ) направлен на повышение местного потенциала для совместного планирования процесса развития и улучшения доступа к надежной инфраструктуре в целевых сообществах.

Проект включает три компонента: (1) повышение потенциала органов местного самоуправления и сообществ, (2) сельские инвестиции, включающие (2.1) гранты на подпроекты и (2.2) малые гранты на микропроекты и (3) управление проектом.

Деятельность Компонента 2 направлена на улучшения доступа к социальной и экономической инфраструктуре сельских жителей за счет предоставления грантов сельским сообществам, прошедшим конкурсный отбор.

Одним из элементов данного Компонента является «Частичный ремонт системы водоснабжения в селе Первомай, Сокулукского района, Чуйской области». Ремонт системы водоснабжения, который является муниципальной собственностью Первомайского АА.

2. Общая информация о районе и айыл окмоту

Район образован в 1953 году. Площадь района – 2,0 тыс. км², 1 город, 19 айльных округов:


Административно-территориальное деление

Городской населённый пункт город Шопоков.

Сельские населённые пункты (сёла), входящие в 19 айльных (сельских) округов:

1. **Асылбашский айльный округ:** Асыл-Баш (центр), Кировское;
2. **Ат-Башинский айльный округ:** Манас (центр), Ак-Джол, Лесное, Терт-Кол;
3. **Военно-Антоновский айльный округ:** Военно-Антоновка (центр);
4. **Гавриловский айльный округ:** Гавриловка (центр), Жыламыш, Романовка, Шалта;
5. **Джаны-Джерский айльный округ:** Джаны-Джер (центр), Верхневосточное, Западное, Зелёное, Нижневосточное;
6. **Джаны-Пахтинский айльный округ:** Джаны-Пахта (центр), Ак-Кашат, Заря, Майское, Мирный;
7. **Айльный округ имени Кайназаровой:** Чат-Кёль (центр), Белек, Тюз;
8. **Камышановский айльный округ:** Камышановка (центр);
9. **Айльный округ имени Крупской:** Сокулук (центр), Арал-Ближний, Арал-Дальний, 1-е Мая;
10. **Кун-Тууский айльный округ:** Кунтуу (центр), Достук, Малая Шалта, Шалта, Чон-Джар;
11. **Кызыл-Тууский айльный округ:** Кызыл-Туу (центр), Кара-Сакал, Новое, Токбай, Маловодное, Исмаил;
12. **Нижнечуйский айльный округ:** Нижнечуйское (центр), Мирное, Садовое, Северное, Степное, Талтак;
13. **Новопавловский айльный округ:** Новопавловка (центр), Учкун;
14. **Орокский айльный округ:** Джал (центр), Верхний Орок, Калтар, Кашка-Баш, Нижний Орок, Плодовое, Сарбан, Селекционное;
15. **Первомайский айльный округ:** Первомайское (центр), Национальное, им. Панфилова;
16. **Сазский айльный округ:** Саз (центр), Конуш;
17. **Сокулукский айльный округ:** Сокулук (центр);
18. **Тош-Булакский айльный округ:** Тош-Булак (центр), Берулу, Четинди;

19. **Фрунзенский аильный округ:** с. Фрунзе (центр) (ранее — совхоз Фрунзе), Комсомольское, Озёрное, Студенческое.

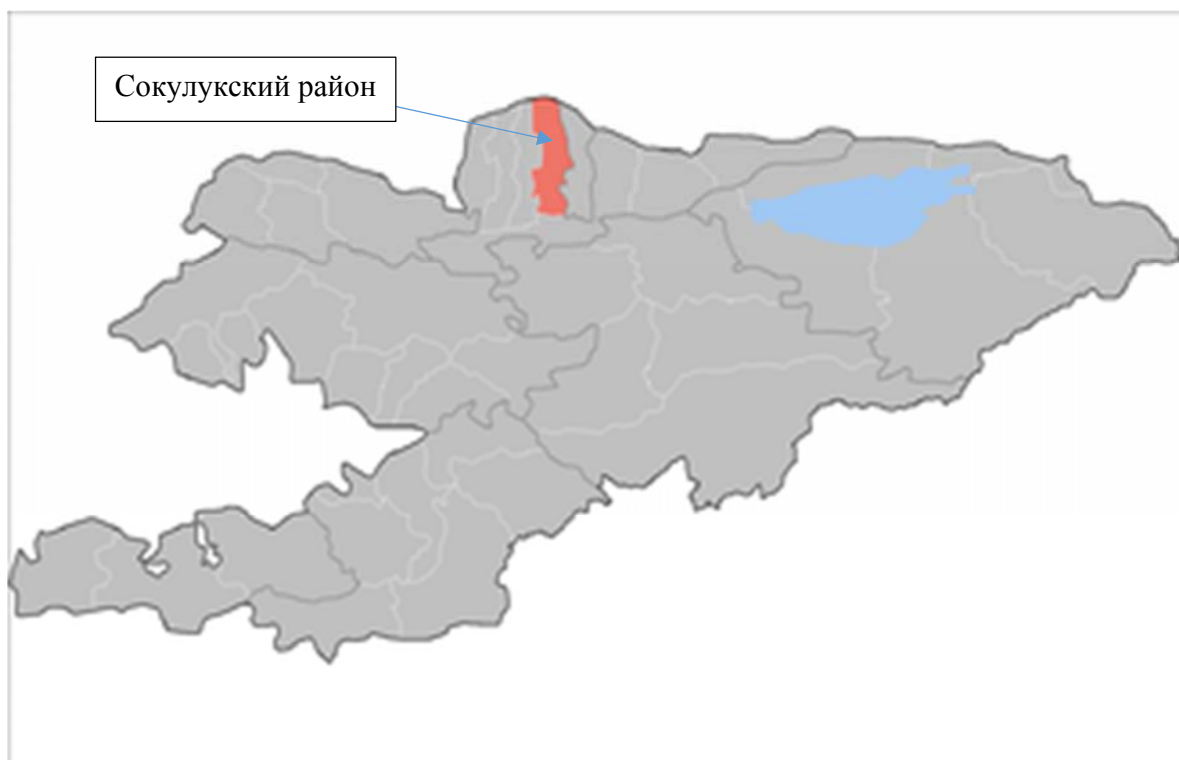

Всего в районе населенных пунктов 67 (село Сокулук относится к аильным округам им.Крупский и Сокулукскому). Численность постоянного населения по итогам переписи населения 2009 года составляет 159 231 человек, в том числе г. Шопоков 8 749 человек. Плотность населения 79,6 человек на 1км² площади.

Административный центр района с. Сокулук с постоянным населением 11 968 человек.

Относительно территории области территория района составляет 10,0%, население – 19,8% относительно общего количества жителей Чуйской области. Сокулукский район расположен в центральной части Чуйской долины и ограничен: с севера – территорией Республики Казахстан; с запада – территорией Московского района; с юга – гребнем Кыргызского хребта; с востока – территорией Аламудунского района.

Территория района вытянута по уклону с юга на север, включает северные склоны Кыргызского хребта, занимающие южную треть площади района, предгорную зону с уклоном до 2° и равнинную часть с уклонами менее 0,5° в северном направлении.

Горная часть представлена скальными породами палеозойского возраста, долинная – аллювиально-пролювиальными, песчано-глинистыми и крупнообломочными породами неоген-четвертичного возраста. Абсолютные отметки рельефа по высоте возрастают с северных границ района от 580 до 1100 м в долинной части до 4400 м на гребне Кыргызского хребта.

Климат континентальный с сухим жарким летом и умеренно-холодной зимой. Средняя температура июля 25°C. Осень сухая, теплая с последующим резким переходом к зиме. Снежный покров непостоянный. Количество дней в году со снежным покровом 71, высота снежного покрова в среднем 21 см в долинной части района. На северных склонах Кыргызского хребта в зависимости от абсолютных отметок число дней в году со снежным

покровом и высота снежного покрова увеличиваются. Зависимость эта отражается следующими цифрами: 1000 м высота – 25 см высота снежного покрова – 68 дней в году со снежным покровом; 1500 м – 26 см – 91 дн; 2000 м – 46 см – 118 дн; 2500 м – 66 см – 146 дн; 3000 м – 84 см – 183 дн; 3500 м – 115 см – 243 дн.

Горные реки, берущие свое начало на северных склонах Кыргызского хребта преимущественно смешанного ледниково-снегового и дождевого питания с наибольшими суммарными расходами, приходящимися на июль-август. Наиболее крупными водотоками района являются: р. Конок – 1% расход 20,8 м³/с; р. Жыламыш – 29,0 м³/с; р. Сазбулак – 25,1 м³/с; р. Бурли – 131,0 м³/с; р. Четенди – 39,2 м³/с; р. Сарымсакты – 45,4 м³/с; р. Кашка-Суу – 89,0 м³/с; р. Сокулук – 61,5 м³/с. Горные реки имеют сильно заглубленные русла с блуждающими в припойменных понижениях многочисленными рукавами. При входе в долины значительная часть стока рек разбирается на орошение. В долинной части широко распространена овражно-балочная сеть с постоянными и временными водотоками дождевого и грунтового питания.

Ирригационная сеть развита повсеместно в центральной и преимущественно в северной части района и представлена многочисленными каналами общей протяженностью более 1200 км с различной пропускной способностью (наиболее крупные БЧК, канал Тош), 51 искусственными водоёмами. В средней части района имеются заболоченные участки и развита коллекторно-дренажная сеть.

В экономическом отношении один из самых развитых районов. В сельском хозяйстве выращиваются зерновые культуры, картофель, овощи. Из пригодных к сельхозназначению 77 тыс. га – пашни (из них 53,7 тыс. га орошаемые), 96,8 тыс. га пастбища. Имеется 40 356 домохозяйств. В районе расположены следующие промышленные предприятия: заводы торгового машиностроения, сахарный, хлебные,

металлических изделий, строительного фарфора, а также филиал обувной фабрики «Тулпар» и комбинат благоустройства.

По территории района проходят железная дорога Луговая – Бишкек - Балыкчы и автодорога Бишкек – Ош.

Население села Первомайское составляет 2019 человек, из них 1038 женщины и 981 мужчин. Количество дворов в селе 524.
Этнический состав (количество людей)

№	Национальность	Итого
a.	Кыргызы	1143
b.	Узбеки	13
c.	Русские	453
d.	Дунгане	0
e.	Уйгуры	11
f.	Татары	17
g.	Казахи	9
h.	Таджики	6
i.	Армяне	7
j.	Корейцы	101
k.	Украинцы	30
l.	Немцы	27

Рис. 2. Место расположения водонапорной башни





Рис. 3-6. Фото объекта

3. Основные планируемые работы

По микропроекту предусматривается ремонтно-восстановительные работы системы водоснабжения в с.Селекция. Основные виды работ будут проводится на территории

водозабора, будет произведен ремонт и замена оборудования на двух насосных станциях, на трех водонапорных станциях, на водонапорной башни, благоустройство территории водозаборов и восстановление колодцев в количестве 5 штук.

Водонапорная станция (ВНС-1, ВНС 1-1, ВНС-2)

- Демонтаж глубинного насоса;
- Монтаж водоподъемной трубы с обратным клапаном диаметром 108 мм;
- Установка задвижек с паранитовой прокладкой;
- Установка отводов диам 100 мм;
- Установка фланцев диам.100 мм;
- Прокладка трубопроводов системы водоснабжения 4,5/4,5 м;
- Огрунтовка металлических труб 1,57 м2;
- Масляная окраска металлических труб 1,57 м2.
- Прокладка электрического кабеля ВВН глубинных скважинных насосов;
- Устройство щита управления насосом;
- Прокладка электрического кабеля.

Насосная станция (НС №1, НС №2)

- Разработка грунта вручную под фундамент
- Устройство бетонного фундамента
- Засыпка вручную щебнем
- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
- Кладка стен из кирпича
- Устройство стропил
- Устройство обрешетки
- Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
- Устройство полов бетонных толщиной 100 мм
- Штукатурка внутренних и наружных стен
- Известковая окраска стен;
- Установка решетчатых металлических дверных блоков в готовые проемы
- Установка задвижек с паранитовой прокладкой установка фланцев
- Установка насосов центробежных с электродвигателем;
- Устройство щита управления насосом по автоматизации процесса
- Прокладка электрического кабеля грунтовка металлических труб
- Масляная окраска металлических труб 2,73м2

Водонапорная башня:

- Замена водогазопроводных труб диаметром 108 мм;
- Установка задвижек с паранитовой прокладкой диам.100 мм;
- Установка отводов диам. 100 мм;
- Установка фланцев диам. 100 мм;
- Огрунтовка металлических труб 7,7 м2;
- Масляная окраска металлических труб 7,7 м2;
- Демонтаж бактерацидной установки;
- Ремонт демонтированной бактерацидной установки;
- Устройство бактерацидной установки.

Водопроводная сеть (восстановление колодцев в количестве 5 штук)

- Разработка грунта вручную -13,5 м2
- Устройство круглых колодцев из сборного железобетона
- Демонтаж задвижек диам.200 мм.;
- Монтаж задвижек диам.200мм.;
- Устройство подстилающих бетонных слоев;
- Демонтаж задвижек диам. 150мм.;

- Монтаж задвижек диам.150 мм.

Благоустройство территории

- Демонтаж ворот с калиткой
- Установка ворот с калиткой
- Огрунтовка ворот с калиткой
- Масляная окраска

4. Минимизация социальных рисков

13 июня 2019 года в с. Первомайское в здании клуба были проведены общественные консультации по микропроекту. В данном мероприятии приняли участие жители села, а также представители АО и ЭПРО АРИС (ознакомиться с Протоколом встречи можно на странице 20). Ориентировочное время строительных работ составит около 1 месяца. Планируется завершить работы до наступления зимнего периода. Отключение воды возможно на короткий период, в этом случае население будет извещено дополнительно, до этих работ по подключению, вода будет подаваться без изменений действующего графика

5. Объем и цели ПУОСС

ПУОСС считается обязательным документом, который необходимо соблюдать в ходе реализации микропроекта. ПУОСС состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. План управления окружающей и социальной средой описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате строительства водонапорной башни, строительства сторожки включая вопросы охраны труда и техники безопасности, ремонтных работ, сбора и утилизации твердых и строительных отходов.

АРИС наряду с ОМСУ несет ответственность за мониторинг соответствия всех финансируемых в рамках микропроекта мероприятий с мерами охранной политики Всемирного банка в экологической и социальной сферах, действующих в отношении ПСИ-3, а также с требованиями национального законодательства КР. Экологический мониторинг работ (глава 7) будет проводиться согласно ПУОСС, описанному в настоящем документе. Экологический и социальный мониторинг предполагает регулярный осмотр участков проведения всех физических мероприятий по микропроекту, финансируемых подрядчиками микропроекта, и отслеживание реализации ПУОСС.

Подрядчики микропроекта обязаны соблюдать ПУОСС. Строительный подрядчик должен располагать специальным персоналом, ответственным за реализацию ПУОСС на этапе строительства. Специалист АРИС на местах будет отслеживать выполнение мер по смягчению воздействий и соблюдению добросовестной практики, предписанной данным документом, и в случае выявления недостатков уведомит подрядчиков о выявленных проблемах и потребует принять корректирующие меры. ПУОСС будет включен в тендерную документацию на выполнение работ, и таким образом, подрядчики будут обязаны соблюдать требования ПУОСС.

6. Экологическое законодательство

Основными нормативными документами, регулируемыми мероприятия по охране окружающей среды, являются:

№	Законодательный акт	Номер Год принятия	Назначение / содержание
Основные положения законодательства по охране окружающей среды			
1	Закон КР «Об охране окружающей среды»	№53 от 1999 г	Устанавливает базовые принципы охраны окружающей среды и обеспечивает правовые полномочия создания экологического качества, установления системы мониторинга и контроля за окружающей средой Среди стандартов и норм экологического качества, авторизированных в рамках данного закона, представлены следующие имеющие отношение к проекту: нормы максимально безопасной концентрации опасных веществ в воздухе, воде; стандарты использования природных ресурсов; нормы максимально безопасных уровней шума, вибраций и других опасных физических воздействий. Данный закон устанавливает требования по проведению экологической оценки в целях предотвращения возможных вредных экологических воздействий. Он запрещает финансирование или реализацию проектов, связанных с использованием естественных ресурсов без получения положительного заключения Государственной экологической экспертизы.
2	Закон КР «Об экологической экспертизе»	№54, от 1999 г	Является основным законодательством, касающимся проведения экологической оценки. В его задачи входит предотвращение негативных воздействий на здоровье людей и окружающую среду, происходящих в результате экономической или другой деятельности и обеспечение соответствия такой деятельности экологическим требованиям страны.
3	Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»	N151, от 2009 г.	Применяется в целях охраны окружающей среды, определяет основные положения технического регулирования в области экологической безопасности и устанавливает общие требования к обеспечению экологической безопасности при проектировании и осуществлении деятельности на объектах хозяйственной и иной деятельности для всех юридических и физических лиц.
4	Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызской Республике	№ 60 от 13.02.2015 года	Устанавливает порядок проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС). Целью проведения ОВОС является предотвращение и/или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.
5	Закон КР «Об охране атмосферного воздуха»	№51 от 1999 года	Регулирует отношения по использованию и охране атмосферного воздуха.
6	Закон КР «Об отходах производства и потребления»	№89 от 2001г	Определяет государственную политику в области обращения с отходами производства и потребления и призван содействовать предотвращению отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека при обращении с ними, а также максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья.
7	Закон КР «Об охране и использовании растительного мира»	№53 от 2001 г.	Устанавливает правовые основы для обеспечения эффективной охраны, рационального использования и воспроизводства ресурсов растительного мира
8	Закон КР «О местном самоуправлении и местной государственной администрации»	№101 от 2011 г	Устанавливает принципы организации местной власти на уровне административно-территориальных единиц Кыргызской Республики
Закон «О доступе к информации»			
9	Закон «О доступе к информации, находящийся в ведении Государственных органов и органов местного самоуправления КР»	№213 от 28.12.2006 г.	Настоящий закон регулирует права и обязанности государственных органов по предоставлению информации местному населению, чтобы достичь прозрачность работы

Помимо перечисленных выше законодательных актов, в республике действует ряд нормативных документов, определяющих требования к импорту, регистрации, оценке

опасности химических веществ и отходов, оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье.

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 июля 1995 года № 279 «О Национальном регистре потенциально токсичных химических веществ».

Порядок проведения государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ.

СанПиН 2.1.7.010-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Перечисленные выше законодательные акты определяют следующие ключевые задачи по охране окружающей среды:

- обязательное проведение ГЭЭ;
- стандарты использования природных ресурсов;
- защиту атмосферного воздуха, земли и воды от загрязнения, засорения и истощения;
- улучшение системы экологического мониторинга;
- нормы максимально безопасных уровней шума, вибраций и других опасных физических воздействий.

7. План мероприятий по охране окружающей среды

Экологические и социальные компоненты	Воздействия	Предлагаемые меры по снижению воздействий ¹	Институциональная ответственность за минимизацию воздействий	Стоимость мер по смягчению воздействия ²
Период строительства 1 месяц				
Физическая среда				
Почва	Строительный мусор	-Сортировка всех видов отходов, повторное использование и переработка, при возможности. -Утилизация отходов, которые не могут быть повторно использованы либо переработаны; вывоз и утилизация отходов на отдельные отвалы и в сотрудничестве с местной компанией по утилизации отходов; запрет на открытое сжигание мусора. -Минеральные отходы от строительства и демонтажных работ должны быть отделены от общих и органических отходов, жидкие и химические отходы должны сортироваться и храниться в специальных контейнерах. -Все документы по вывозу и утилизации отходов должны вестись соответствующим образом в качестве	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов

¹ Мероприятия, требующие финансовых затрат, должны быть предусмотрены в ВОР,

² Стоимость работ по смягчению воздействий определяется подрядчиком в тендерных документах за те позиции, которые являются сферой его ответственности.

		доказательства надлежащей утилизации мусора на площадке. -Образующиеся строительные и бытовые отходы, будут утилизироваться в специально отведенные муниципальными органами управления места, которые могут быть использоваться повторно, будут сданы на переработку (металлолом, деревянные отходы, др.); -Установка контейнеров для сбора ТБО на территории школы; -Установка биотуалета для работающих; -ТБО и строительные отходы сжигаться не будут на строительных площадках;		
Водные ресурсы	Загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, строительными отходами	-Использование лишь отдельно отведенного участка. -Применение базовых надлежащих норм строительства и стандарты, применяемые во время строительства. -Ежедневные проверки техники на наличие утечек масла; запрет на мытье машин на строительной площадке и возле открытых водных объектов. -Запрет на засорение бытовыми и строительными отходами траншей.	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Качество воздуха	Пыль во время строительства Низкое качество	Борьба против пыли путем смывания водой или другими средствами; соответствующее хранение отделочных	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную

	внутреннего воздуха Запахи	материалов, вентиляция помещения; соответствующее планирование, размещение и удаление отходов	мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Биологическая среда				
Фауна и флора	Санитарная рубка деревьев	-получение разрешения у АО о рубке или подрезке деревьев	Подрядчик несет ответственность за выполнение. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	
Социальная среда				
Эстетика и ландшафт	Образование насыпей	-очистка территории от грунта -вывоз лишнего грунта на участки согласованные с АО	Подрядчик несет ответственность за выполнение. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	
Сообщества	Жалобы общественности	-размещение информационных баннеров в местах строительства	Подрядчик несет ответственность за выполнение. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
	Приток рабочей силы	-Найм работников, проживающих на участке производства работ (по	Подрядчик несет ответственность. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и

		возможности); -Заключение трудовых договоров с работниками	технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Культурное наследие	Археологические находки	-В случае обнаружения каких-либо археологических артефактов, работы должны быть приостановлены и информация о находке должна быть передана соответствующим органам власти	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор - Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Безопасность, здоровье персонала и населения	Травмы и несчастные случаи на участке производства работ, при эксплуатации инструментов	-Соблюдение СН КР 12-01:2018 безопасность труда в строительстве; -Оснащение сварщиков защитным оборудованием, резиновыми перчатками, специальными ботинками и шлемами; -проведение инструктажа до начала сварочных работ; -Строгое соблюдение правил использования защитного снаряжения, которые, как минимум, включает в себя: (а) респиратор / сварочные защитные маски; (b) защитную одежду: вся поверхность кожи должна быть защищена от попадания расплавленного металла и искр. Защитная одежда включает: рубашки с длинным рукавом; брюки, которые	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по охране труда и техники безопасности.. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор. Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор. Государственный уполномоченный орган.	Без дополнительных затрат: общая ответственность подрядчика по выполнению работ

		покрывают верхние части обуви; перчатки; ботинки или сапоги; (с) устройства для защиты глаз от мусора и от воздействия ультрафиолетового излучения; (d) шлемы; -Строгое соблюдение техники безопасности при работе на высоте: (а) допуск к самостоятельной работе на высоте допускаются лица не моложе 18 лет; (б) лица прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к выполнению работ на высоте, (в) проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа, обучение и стажировку на рабочем месте, (г) проверка знаний требований охраны труда и по правилам безопасности при работе на высоте и получившие допуск на право выполнения этой работы. (д) обязательное использование специального снаряжения (страховочные пояса (проверка его на прочность), применение предохранительных ограждений и т.д.), (е) места возможного падения работников должны надежно закрываться или ограждаться и обозначаться знаками безопасности;(ж) нижние опорные концы приставных лестниц и лестниц-стремянки должны иметь		
--	--	--	--	--

		противоскользящие устройств и надежно установлены; -Строгое соблюдение требований пожарной безопасности: наличие средств пожаротушения на участке работ. -наличие списка и номера телефонов близлежащих экстренных служб.		
Период эксплуатации				
Физическая среда				
Почва	Эрозия почвы при нарушении целостности сооружений	Постоянное техническое обслуживание	СООПВ, Айыл Окмоту	
Водные ресурсы	Нарушение целостности водоводов	Постоянное техническое обслуживание	СООПВ, Айыл Окмоту	
Качество воздуха	Не ожидается		СООПВ, Айыл Окмоту	
Биологическая среда				
Флора и фауна	Не ожидается		СООПВ, Айыл Окмоту	
Социальная среда				
Эстетика и ландшафт	Не ожидается		СООПВ, Айыл Окмоту	
Культурное наследие	Не ожидается		СООПВ, Айыл Окмоту	
Безопасность, здоровье персонала и населения	Нарушение эксплуатационного режима	Регулярное профилактическое обслуживание	СООПВ, Айыл Окмоту	

8. ПЛАН МОНИТОРИНГА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Этап реализации подпроектов/микропроектов	Какой параметр подлежит мониторингу	Где будет осуществляться мониторинг?	Как будет осуществляться мониторинг? /тип оборудования для мониторинга	Когда? (частота измерений)	Стоимость мониторинга ¹³ (стоимость оборудования или сумма расходов подрядчика, необходимая для осуществления мониторинга?)	Институциональная ответственность за мониторинг	Дата начала
Строительство	Шум Воздух Транспорт Утилизация и хранение отходов Загрязнение почвы и воды	На строительном участке На строительном участке На строительном участке На строительном участке На	Портативные шумомеры Портативные приборы для измерения Визуально Согласно плану и обзору. Визуально И приборами для измерения Визуально	Постоянно Еженедельно Постоянно Согласно плану, но минимум еженедельно Постоянно Согласно плану	Критерии /спецификац ии для внесения в тендерную и контрактную документаци ю. Не рассматрива ется в качестве отдельной статьи расходов	1. Инспекция строительной площадки осуществляется со стороны АРИС для обеспечения соответствия с ПУОСС. 2. Государственные инспекторы Департамента архитектурно- строительного надзора (ДАСН) будут проводить надзор за выполнением проектных решений в ходе строительных и установочных работ либо в ходе реконструкции объектов, за качеством строительных материалов, сооружений. Они будут участвовать при сдаче в эксплуатацию завершенных объектов строительства. 3. ГЭТИ (Госэкотехинспекция), осуществляющий	После передачи объекта Подрядчику .

	Демонтаж строительной площадки	строительном участке	Визуально	Постоянно		государственный экологический надзор, имеет право на надзор в установленном порядке после предоставления соответствующих идентификационных документов согласно экологическим положениям, нормативам, мероприятиям по охране окружающей среды в ходе реализации проекта	
	Безопасность рабочих	На строительном участке					

9. ИНФОРМАЦИЯ О МОС И МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

По всем вопросам относительно реализации ПСИ-3 любые заинтересованные лица проекта могут обратиться в МОС АРИС и имеют следующие права:

- Право на получение информации;
- Право на противодействие нецелесообразному вмешательству со стороны третьих лиц;
- Право на участие в тендерном процессе без случаев мошенничества и коррупции.

Любое заинтересованное лицо проекта ПСИ-3 (включая жителей села, подрядчиков, сотрудников проекта, органов власти и других вовлеченных сторон) могут подать жалобу, если он/она считает, что одно или несколько из выше представленных прав, либо какой-либо из проектных принципов или процедур было нарушено.

Жалобы подлежат публичному разглашению, но личность лица, подающего жалобу, остается конфиденциальной, только если лицо не решит раскрыть свою личность. Личность всех, подающих жалобы, обеспечивается конфиденциальностью.

Механизм рассмотрения жалоб

Регистрация обращения. *Обращения, полученные в письменном, устном или электронном виде, регистрируются в журнале МОС, а затем вносятся в конфигурацию МОС для анализа и мониторинга входящей корреспонденции, содержащей следующую информацию (в зависимости от вида обращения):*

- Фамилия, имя, отчество;
- Адрес регистрации и проживания или номер телефона;
- Содержание обращения;
- Другая справочная информация.

Обращения могут быть поданы анонимно. В случае, если обращения поступило при отсутствии каких-либо вышеперечисленных данных, оно фиксируется в журнале входящей корреспонденции МОС, а результаты обращения будут опубликованы в СМИ на местном уровне, на сайте АРИС либо обнародованы на сессии Айыльных Кенешей.

Контроль исполнения. После завершения расследования, бенефициар получит уведомление о решении, принятом АРИС по его делу. В случае, если гражданин/бенефициар не удовлетворен решением, полученным по результатам рассмотрения обращения, он имеет право на апелляцию. Инструкции по подаче апелляции будут предоставлены вместе с ответом.

Апелляция. Апелляция рассматривается специальным Комитетом АРИС по рассмотрению обращений. Исполнительный директор АРИС сформирует Комитет по рассмотрению обращений из руководителей проектов и руководителей отделов, которые будут проводить слушание апелляций. После апелляционного рассмотрения обращения, гражданин/бенефициар неудовлетворенный решением Комитета, имеет право на обжалование решения в судебном порядке.

Публикация обращений. После того, как обращение (заявления, предложения, жалобы, запросы, позитивные отзывы) разрешено, для поощрения использования МОС, меры, предпринятые для ее разрешения, будут опубликованы в средствах массовой информации на местном уровне. По желанию личность заявителя будет сохранена в тайне.

Каналы обратной связи. В рамках ПСИ-3 АРИС установлены следующие каналы связи, посредством которых жители/бенефициары могут направить обращения на разных этапах реализации проекта:

- a. WhatsApp (система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных устройств с поддержкой голосовой и видеосвязи – номера МОС + 996 550 700 522; +996 770 700 522);
- b. Социальные сети (Фейсбук – Официальная страница «Агентства развития и инвестирования сообществ»);
- c. Веб-сайт АРИС: www.aris.kg;
- d. Устные или письменные обращения, полученные в ходе рабочих встреч на местах, фасилитаторов, молодежных кураторов и/или ЭПРО;
- e. Входящая корреспонденция наручно в приемную АРИС;
Входящая корреспонденция по электронной почте bfm@aris.kg.

Приложение 1. Протокол общественных слушаний

Протокол № 2

Общественных консультаций по обсуждению Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) «Частичный ремонт системы питьевого водоснабжения в селе Первомайское»

с. Первомайское
г.

13 июня 2019

Цель: Ознакомление заинтересованных сторон с мерами экологической и социальной безопасности.

Место и время проведения: актовый зал айыл окмоту с. Первомайское 11:30 час.
Присутствовало: 99 человек

Общественные консультации по ПУОСС открыл глава АО – Караталов Д. Затем, эксперт по поддержке районных общин (ЭПРО) Баялиев У. вкратце рассказал о проекте ПСИ-3 и выступил с презентацией Плана Управления окружающей и социальной средой.

В выступлении кратко были освещены вопросы:

- Требования Операционной политики Всемирного Банка ОП 4.01 по экологической оценке;
- Требования природоохранного законодательства Кыргызской Республики;
- Содержание ПУОСС;
- Компоненты окружающей среды, которые могут быть подвержены воздействию в ходе реализации проекта;
- Меры смягчения, предложенные в ПУОСС.
- Технические решения

Были заданы следующие вопросы:

Вопрос: Жамапаков Ж. – Будут ли воздействия на здоровье людей или окружающую среду во время ремонта системы водоснабжения?

Ответ: ЭПРО Баялиев У. Т. – Воздействий не будет, но при возникновении экологической проблемы будут решаться незамедлительно.

Вопрос: Житель – Сколько времени займет ремонт системы водоснабжения?

Ответ: Сартпаев Э. – В зависимости как будет работать подрядчик. Около месяца.

Вопрос: Житель – Когда начнутся работы и как мы узнаем об отключении?

Ответ: Сартпаев Э. – Работы начнутся после проведения тендера. Будет собрание жителей села, во всех общественных местах вывесим график работы строителей.

Глава АО Караталов Д. – Предупредил, что во время ремонтных работ системы водоснабжения будет отключена подача питьевой воды на некоторое время. В связи с чем прошу запастись питьевой водой на это время.

Вопрос: Житель- Ремонт водоснабжения исправить ли ситуацию в селе (будет ли обеспечение бесперебойной подачи воды)

Ответ : Председатель СООПТВ Жаманакон Ж- Да исправит, при увеличении тарифа на воду и своевременной оплаты

РЕШЕНО:

Одобрить План управления окружающей и социальной средой «Ремонт системы питьевого водоснабжения в селе Первомайское», т.к. он является достаточным, охватывает все компоненты окружающей и социальной среды и приемлем для реализации.

Глава АО



Д. Караталов

Ответственный секретарь

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the responsible secretary.

А. Керимова

Приложение 2. Список участников общественных слушаний

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЖИВОВИДИЗОВАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «Частичный ремонт системы питьевого водоснабжения в селе Первомайское»

ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА

Село Первомайское

Айыл аймак Первомайский

Дата проведения информирования 10.06.2018

Всего 29 человек из которых 29 человек

№	Ф.И.О.	Собственный телефон или адрес	адрес	подпись
1	Аманжолуев А.			
2	Аманжолуев А.			
3	Аманжолуев А.			
4	Аманжолуев А.			
5	Аманжолуев А.			
6	Аманжолуев А.			
7	Аманжолуев А.			
8	Аманжолуев А.			
9	Аманжолуев А.			
10	Аманжолуев А.			
11	Аманжолуев А.			
12	Аманжолуев А.			
13	Аманжолуев А.			
14	Аманжолуев А.			
15	Аманжолуев А.			
16	Аманжолуев А.			
17	Аманжолуев А.			
18	Аманжолуев А.			
19	Аманжолуев А.			
20	Аманжолуев А.			
21	Аманжолуев А.			
22	Аманжолуев А.			
23	Аманжолуев А.			
24	Аманжолуев А.			
25	Аманжолуев А.			
26	Аманжолуев А.			
27	Аманжолуев А.			
28	Аманжолуев А.			
29	Аманжолуев А.			

№	Ф.И.О.	Код страны телефонный адрес	адрес	Подпись
10	Бондарь Михаил			
11	Бондарь Михаил			
12	Бондарь Михаил			
13	Бондарь Михаил			
14	Бондарь Михаил			
15	Бондарь Михаил			
16	Бондарь Михаил			
17	Бондарь Михаил			
18	Бондарь Михаил			
19	Бондарь Михаил			
20	Бондарь Михаил			
21	Бондарь Михаил			
22	Бондарь Михаил			
23	Бондарь Михаил			
24	Бондарь Михаил			
25	Бондарь Михаил			
26	Бондарь Михаил			
27	Бондарь Михаил			
28	Бондарь Михаил			
29	Бондарь Михаил			
30	Бондарь Михаил			
31	Бондарь Михаил			
32	Бондарь Михаил			
33	Бондарь Михаил			
34	Бондарь Михаил			
35	Бондарь Михаил			
36	Бондарь Михаил			
37	Бондарь Михаил			
38	Бондарь Михаил			
39	Бондарь Михаил			
40	Бондарь Михаил			
41	Бондарь Михаил			
42	Бондарь Михаил			
43	Бондарь Михаил			
44	Бондарь Михаил			
45	Бондарь Михаил			
46	Бондарь Михаил			
47	Бондарь Михаил			
48	Бондарь Михаил			
49	Бондарь Михаил			
50	Бондарь Михаил			
51	Бондарь Михаил			
52	Бондарь Михаил			
53	Бондарь Михаил			
54	Бондарь Михаил			
55	Бондарь Михаил			
56	Бондарь Михаил			
57	Бондарь Михаил			
58	Бондарь Михаил			
59	Бондарь Михаил			
60	Бондарь Михаил			
61	Бондарь Михаил			
62	Бондарь Михаил			
63	Бондарь Михаил			
64	Бондарь Михаил			
65	Бондарь Михаил			
66	Бондарь Михаил			
67	Бондарь Михаил			
68	Бондарь Михаил			

№	Ф.И.О.	Содержание телефонной адрес	поиск	Подпись
147				
148				
149				
150				
151				

О.А.О. Иванов Иван Иванович

Подпись

контактные телефоны 812 601 77 381

Приложение 3. Фото отчет по проведению общественных слушаний в с. Первомай



Приложение 4. Чек-лист оценки социальных рисков и воздействий

Чеклист по скринингу для оценки социальных рисков и воздействий от под-проектных мероприятий

Название под-проектных мероприятий Частичная реконструкция

Область Частная

Район Свердловский

Айылный аймак Чурапчалыкский

Айыл Урваккай

Возможные Социальные Воздействия	Да	Нет	Предоставить детали/кол-во, если возможно
1. Будут ли проектные мероприятия включать новые физические строительные работы?		✓	
2. Включают ли мероприятия улучшения или реабилитацию существующих объектов?	✓		
3. Вероятно ли, что мероприятия вызовут непоправимый ущерб или утрату домовладений, других активов, истощения ресурсов?		✓	
4. Выбранный участок для работ свободен от обременений и находится во владении Общественности/правительства/общества?	✓		
5. Требуется ли под-проектные мероприятия приобретения частных земель?		✓	
6. Если участок находится на частной территории, может ли эта земля быть приобретена путем переговоров (по обоюдному согласию)?			не предусмотрено
7. Если требуется приобрести земельный участок, известен ли размер участка и какой статус права собственности?			не предусмотрено
8. Приводят ли мероприятия под-проекта к ограничению доступа к другим жителям/пешеходам/коммерческой деятельности и торговле?		✓	
9. Доступна ли земля для мобилизации и транспортировки строительных материалов в пределах существующего участка/имеется ли право проезда?	✓		
10. Проживают ли/занимаются ли предпринимательской деятельностью non-titled люди на предлагаемой территории/проектном участке под строительство?		✓	
11. Вероятны ли временные воздействия?		✓	
12. Имеется ли возможность переноса, закрытия предпринимательской/коммерческой/хозяйственной деятельности лиц во время строительства?			не предусмотрено
13. Имеются ли временные или постоянное физическое перемещение лиц в связи со строительством?		✓	
14. Включает ли этот проект переселение каких-либо лиц? Если да, предоставляйте детали.		✓	
15. Будет ли потеря/ущерб сельскохозяйственным землям, несобранному урожаю, деревьями?		✓	

16. Будет ли потеря доходов и средств существования для кого-либо в связи с проектными мероприятиями?		✓	
17. Будет ли для людей потеря доступа к объектам, услугам или природным ресурсам постоянным или временным?		✓	
18. Приведет ли проект к потере трудоустройства/работы?		✓	
19. Вызовет ли проект чрезвычайный приток рабочей силы в результате строительства		✓	
20. Требуется ли строительные мероприятия	✓		
21. Вызовут ли под-проектные/строительные мероприятия разрушения/беспорядки среди местного проживающего населения	✓		
22. Создадут ли строительством новых зданий, дренажный канал, линии электропередач износ/повреждение общественных зданий/ресурсов/прилегающих домов, колодец, земель, мест захоронений, детских парков, школ и т.д.	✓		
23. Приведут ли проектные мероприятия к снижению рабочей силы (сокращению рабочих штатов) какого-либо органа	✓		
24. Приведут ли проектные мероприятия к непреднамеренным последствиям, таким как несчастные случаи/разрушения прилегающих зданий	✓		
25. Имеются ли уязвимые группы, которые могут быть повреждены негативным воздействием (включая коренные группы населения) в результате проектных мероприятий?	✓		

И. Давыдов
