



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
(АРИС)

ТРЕТИЙ ПРОЕКТ СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
(ПСИ 3)

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
СРЕДОЙ
(ПУОСС)

**Микро-проект: «Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского
пункта Ак-Чий села Эпкин, Чолпон АА Кочкорского района Нарынской
области»**

Чолпон 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИКРОПРОЕКТУ	3
2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЙОНУ	3
3. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	4
4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ И МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ.....	7
5. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	7
6. УПРАВЛЕНИЕ ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ	9
6.1 Управление асбестосодержащими отходами	9
7. ОБЪЕМ И ЦЕЛИ ПУОСС	10
8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	12
9. План мониторинга мероприятий.....	18
10. ИНФОРМАЦИЯ О МОС И МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ	20
11. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ	21
11.1. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (РУССКИЙ ЯЗЫК).....	22
12. СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЛУШАНИЙ.....	24
13. ФОТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ.....	25
14. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ МИКРОПРОЕКТА.....	26

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АА	Айыльный аймак
АРИС	Агентство развития и инвестирования сообществ
ВБ	Всемирный банк
ГСМ	Горюче-смазочные материалы
ГЭТИ	Государственная экологическая и техническая инспекция
КР	Кыргызская Республика
ОМСУ	Органы местного самоуправления
ОР	Операционное руководство
ОП	Операционная политика
ПРС	Почвенно-растительный слой
ПСД	Проектно-сметная документация
ПСИ	Проект сельских инвестиций
ПМ	План мониторинга
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой
СИЗ	Средства индивидуальной защиты
ЛОВЗ	Лица с ограниченными возможностями здоровья
ПКР	Правительство Кыргызской Республики

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИКРОПРОЕКТУ

Проект сельских инвестиций (ПСИЗ) направлен на повышение местного потенциала для совместного планирования процесса развития и улучшения доступа к надежной инфраструктуре в целевых сообществах.

Проект включает три компонента: (1) повышение потенциала органов местного самоуправления и сообществ, (2) сельские инвестиции, включающие (2.1) гранты на микропроекты и (2.2) малые гранты на микропроекты и (3) управление проектом.

Деятельность Компонента 2 направлена на улучшения доступа к социальной и экономической инфраструктуре сельских жителей за счет предоставления грантов сельским сообществам, прошедшим конкурсный отбор.

Одним из элементов данного Компонента является «Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта Ак-Чий села Эпкин АА Чолпон Кочкорского района Нарынской области».

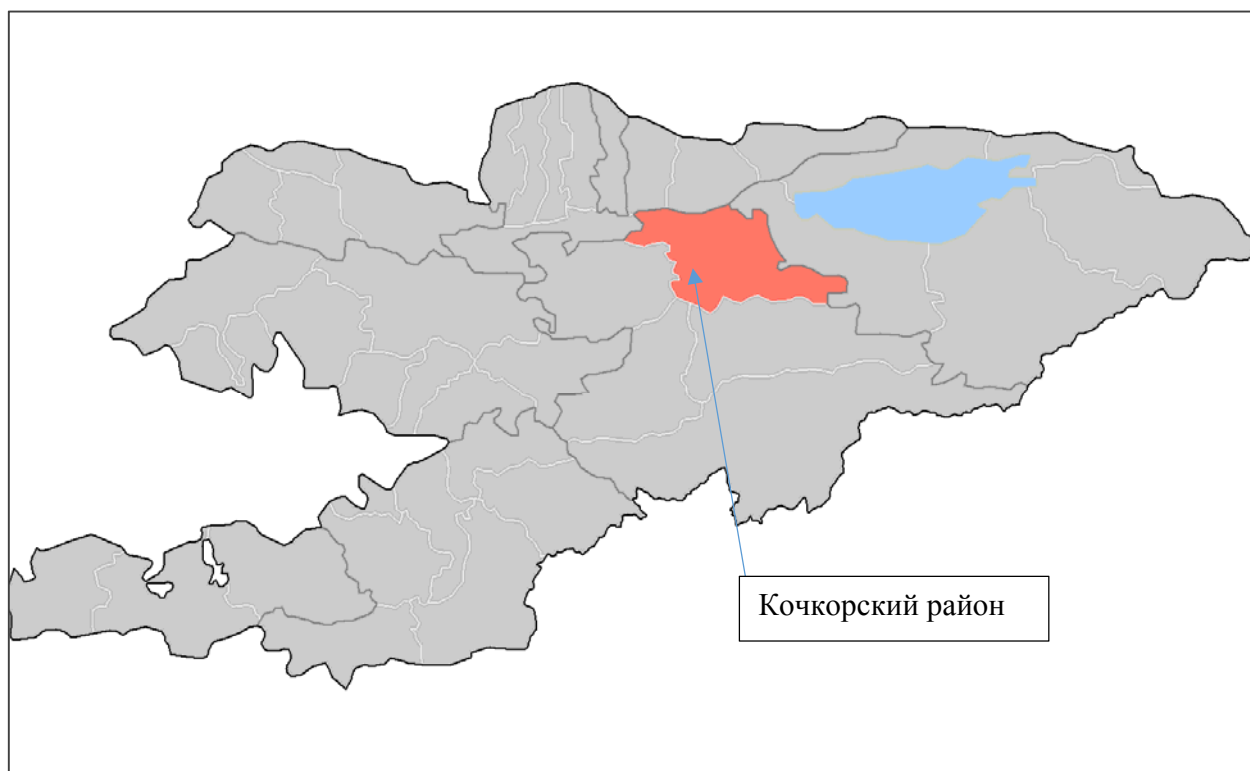


Иллюстрация 2. Схема расположения Кочкорского района

2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЙОНУ

Кочкорский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 6407 км², что составляет 14,3% площади Нарынской области. Численность постоянного населения по итогам переписи населения 2009 года составляет 58267 человек. Средняя плотность населения составляет 9,1 человек на 1 км². На территории района расположены 31 населенных пунктов, относящихся к 11 айылным округам: Ак-Кыянскому (2 населенных пунктов), Кара-Суускому (5), Кочкорскому (3), Кош-Дёбёнскому (2), Кум-Дёбёнскому (4), Сары-Булакскому (2), Семиз-Бельскому (4), Талаа-Булакскому (2), Чолпонскому (5), Сон-Кульскому (1), Кёк-Джарскому (1).

Административный центр района с. Кочкорка с постоянным населением 9 863 человек.

Кочкорский район расположен в северной части территории Нарынской области и ограничивается с севера Кыргызским, с востока Кара-Мойнокским и Сандыкским, с юга Карагатты и Кызартским, с востока Кара-Кунгей и Укёкским хребтами. Горная территория характеризуется высокой расчлененностью рельефа и большой гравитационной энергией склонов. Перепад абсолютных отметок долинной части изменяется от 1700 до 2400 м, горной зоны от 2400 до 4502 м.

Минимумы температур воздуха могут достигать -25°C в равнинной зоне (максимальный пик -36°C в с. Кочкорка) и -35°C в горной зоне, а максимумы температур воздуха от $+30^{\circ}\text{C}$ - в долинной (максимальный пик $+34^{\circ}\text{C}$ с. Кочкорка) до $+20^{\circ}\text{C}$ - в горной зонах района. Суточный максимум осадков 50 мм в горной части района. Среднегодовое количество осадков изменяется от 300 мм в долинной, до 700 мм в горной зонах. Число дней со снежным покровом в высокогорной зоне варьирует от 100 до 200, в низкогорной и долинной частях от 20 до 25. Высота снежного покрова составляет в долинной части на отметках 2,0-2,4 км (Кочкорская впадина на абсолютных отметках 1,7-2,0 км является практически бесснежной) от 10 до 20 см, в горной зоне на отдельных участках – до 80 см. Снеговые нагрузки изменяются в горной зоне от 30 до 60 кг/м², долинной на высотах 2,0-2,4 км до 31 кг/м², максимальные – до 90 кг/м². Максимальные скорости ветра в равнинной части могут достигать от 19 до 28 м/сек, в горной зоне выше абсолютных отметок 3,5-4,0 км до 55 м/сек.

Основными реками являются реки бассейна р. Чу, Кара-Куджур (максимальный расход 129 м³/сек), Жоон-Арык (131 м³/сек), Восточный Сёок (94,4 м³/сек), Восточный Каракол (64,5 м³/сек), Тюлөк (20,8 м³/сек), Шамшы (7,6 м³/сек), Тюндюк (7,8 м³/сек).

На территории района расположено Орто-Токойское водохранилище на р. Чу объемом 470 млн. м³, пропускной способностью 380 м³/сек, с высотой насыпной плотины 52 м. На юго-западе района находится озеро Сон-Кёль.

Почвы в равнинной части пустынно-степные на карбонатных суглинках и супесях. В горной части почвы горные светло-каштановые, горные лугово-степные.

По территории района проходят автодорога международного значения Бишкек – Нарын – Торугарт, автодороги Кочкорка – Чаек – Арал, Сары-Булак – Джер-Кёчкю.

3. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



Иллюстрация1. Схема расположения ФАП Ак-Чий села Эпкин (участок Ак-Чий)

На участке Ак-Чий села Эпкин проживает 369 человек.

Село Эпкин расположено в западной части Кочкорского района, расстояние до районного центра 37 км. Климат резко континентальный, средняя температура в январе, феврале достигает до 18-20 градусов мороза. В летнее время- июле, августе до 18-20 градусов и выше.

Здание ФАП Ак-Чий находится на участке новостройки Ак-Чий села Эпкин на небольшой возвышенности, в 20-30 метрах от заболоченного участка. На заболоченном участке прорыт дренаж в целях отвода воды.

Глубина залегания грунтовых вод на участке 5 метров.





Иллюстрация 2. Здание фельдшерско-акушерского пункта села Эпкин

Место проведения ремонтных работ: здание фельдшерско-акушерского пункта Ак-Чий села Эпкин АА Чолпон Кочкорского района Нарынской области, находящееся на балансе айыл окмоту Чолпон.

В рамках проектных работ планируется проведение водоснабжения в здании ФАП, устройство герметичного септика.

В ходе ремонтных работ предполагается:

- замена шиферной кровли на кровлю из металла -59 м²,
- частичная замена обрешеток 40 п.м.;
- демонтаж навесного потолка 47 м²;
- укладка утеплителя кровли -59 м²;
- устройство металлического профнастила -59 м²;
- устройство слива из металлической конструкции- 4 шт.
- устройство форточек (дымоход) в топке с пробивкой стен 60х60 см-1 шт;
- устройство качалки для воды 1 шт;
- устройство металлических ограждений с калиткой с окрашиванием в 2 слоя – 100 м²;
- устройство потолка из гипсокартона с добавлением обрешеток 47 м²;
- рытье траншеи для водопровода, канализации глубиной 1,6 м. – 32м³;
- монтаж ж/б колец – 3 шт.
- прокладка трубопроводов канализации, водопровода с обратной засыпкой – 300 п.м.;
- монтаж раковин со смесителями, унитаза с бочком - 1 шт.;
- монтаж водонагревательного бочка - 1шт.;
- устройство «Пеноплекса» толщиной 30 мм с последующей штукатуркой цементным раствором – 65,15 м²;
- утепление фундамента базальтовыми плитами - 16 м²;
- монтаж электропроводки 100 п.м.
- обработка деревянных изделий антисептиком противопожарным-48 м²;
- укладка линолеума с закреплением плинтусов- 47 м²;
- частичная штукатурка внутренних стен 22 м²;
- укрепление трещин – 5 м.п.;
- устройство полов из линолеума – 47 м²;
- устройство отмотски из бетона 26 м²;
- кладка стен внутреннего туалета с последующей отделкой керамической плиткой и отделочными материалами с установкой дверного проема с полотном – 1м³.

Реализация микропроекта будет иметь положительное социальное воздействие на широкий ряд заинтересованных сторон и бенефициаров, в основном молодые семьи, у которых имеются малые дети, пожилые жители, а также малоимущие семьи в том числе ЛОВЗ, которые нуждаются в регулярных

медицинских осмотрах. При улучшении условий в медицинском пункте вышеуказанные категории жителей смогут получать квалифицированную медицинскую помощь не выезжая из села, не неся дополнительные финансовые расходы и экономя время.

Относительно типа, расположения, чувствительности и масштаба, характера и степени потенциального отрицательного экологического воздействия, микропроект «Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Эпкин АА Чолпон Кочкорского района Нарынской области» отнесен к категории В. Для него разработан локальный План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) с оценкой местных экологических и социальных условий и потенциальных воздействий, и мер по их смягчению и предупреждению.

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ И МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ

Проект не предусматривает строительство новых зданий и сооружений. Проект окажет положительное воздействие на социальную среду, т.к. ФАП повысит его безопасность и создаст более комфортные условия пребывания посетителей в учреждении с точки зрения санитарии и гигиены.

Кроме того, ожидается, что существенных потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и социальную среду не будет, при этом какие-либо их проявления могут быть эффективно предотвращены или минимизированы путем применения соответствующих профилактических мероприятий и/или смягчающих мер.

29 июля 2019 в здании ФАП проведены общественные слушания, были проинформированы участники собрания о предстоящих работах по ремонту, место где будет размещен временно ФАП. На период ремонтных работ сотрудники ФАП будет размещен в здании ФАПа в с.ЭпкинАО с необходимым оборудованием, также планируется, что сотрудники будут посещать наблюдаемых пациентов на дому.

5. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Основными нормативными документами, регулирующими мероприятия по охране окружающей среды, являются:

№	Законодательный акт	Номер Год принятия	Назначение / содержание
Основные положения законодательства по охране окружающей среды			
1	Закон КР «Об охране окружающей среды»	№53 от 1999 г	Устанавливает базовые принципы охраны окружающей среды и обеспечивает правовые полномочия создания экологического качества, установления системы мониторинга и контроля за окружающей средой Среди стандартов и норм экологического качества, авторизированных в рамках данного закона, представлены следующие имеющие отношение к проекту: нормы максимально безопасной концентрации опасных веществ в воздухе, воде; стандарты использования природных ресурсов; нормы максимально безопасных уровней шума, вибраций и других опасных физических воздействий. Данный закон устанавливает требования по проведению экологической оценки в целях предотвращения возможных вредных экологических воздействий. Он запрещает финансирование или реализацию проектов, связанных с использованием естественных ресурсов без получения положительного заключения Государственной экологической экспертизы.

2	Закон КР «Об экологической экспертизе»	№54, от 1999 г	Является основным законодательством, касающимся проведения экологической оценки. В его задачи входит предотвращение негативных воздействий на здоровье людей и окружающую среду, происходящих в результате экономической или другой деятельности и обеспечение соответствия такой деятельности экологическим требованиям страны.
3	Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»	N151, от 2009 г.	Применяется в целях охраны окружающей среды, определяет основные положения технического регулирования в области экологической безопасности и устанавливает общие требования к обеспечению экологической безопасности при проектировании и осуществлении деятельности на объектах хозяйственной и иной деятельности для всех юридических и физических лиц.
4	Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызской Республике	№ 60 от 13.02.2015 года	Устанавливает порядок проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС). Целью проведения ОВОС является предотвращение и/или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.
5	Закон КР «Об охране атмосферного воздуха»	№51 от 1999 года	Регулирует отношения по использованию и охране атмосферного воздуха.
6	Закон КР «Об отходах производства и потребления»	№89 от 2001г	Определяет государственную политику в области обращения с отходами производства и потребления и призван содействовать предотвращению отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека при обращении с ними, а также максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья.
7	Закон КР «Об охране и использовании растительного мира»	№53 от 2001 г.	Устанавливает правовые основы для обеспечения эффективной охраны, рационального использования и воспроизводства ресурсов растительного мира
8	Закон КР «О местном самоуправлении и местной государственной администрации»	№101 от 2011 г	Устанавливает принципы организации местной власти на уровне административно-территориальных единиц Кыргызской Республики
Закон «О доступе к информации»			
9	Закон «О доступе к информации, находящийся в ведении	№213 от 28.12.2006 г.	Настоящий закон регулирует права и обязанности государственных органов по предоставлению информации местному населению, чтобы достичь прозрачность работы

	Государственные органы и органы местного самоуправления КР»		
--	---	--	--

Помимо перечисленных выше законодательных актов, в республике действует ряд нормативных документов, определяющих требования к импорту, регистрации, оценке опасности химических веществ и отходов, оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье.

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 июля 1995 года № 279 «О Национальном регистре потенциально токсичных химических веществ».

Порядок проведения государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ.

СанПиН 2.1.7.010-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Перечисленные выше законодательные акты определяют следующие ключевые задачи по охране окружающей среды:

- обязательное проведение ГЭЭ;
- стандарты использования природных ресурсов;
- защиту атмосферного воздуха, земли и воды от загрязнения, засорения и истощения;
- улучшение системы экологического мониторинга;
- нормы максимально безопасных уровней шума, вибраций и других опасных физических воздействий.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ

В ходе ведения ремонтных работ, могут образовываться опасные отходы, содержащие асбест или ртуть. Асбестоцементные отходы и материалы могут быть представлены в виде шифера, покрывающем кровлю здания. Ртуть содержится в люминесцентных лампах, которые используются в качестве освещения здания.

Риск при обращении с асбестом. Асбест является естественным волокнистым материалом, который широко используется в зданиях и других объектах инфраструктуры в 20 веке из-за его прочности и устойчивости к огню и жару. Асбест обычно используется в гофрированных кровельных листах и асбестоцементных трубах.

Все виды асбестовых волокон обладают риском для здоровья человека. Как правило, больший риск возникает при работе непосредственно с асбестом или когда происходит разрушение асбестоцементного материала, такие как обломанные края асбестоцементных труб или сломанных кровельных листов. Поэтому требуются определенные меры предосторожности.

Риск при обращении с ртутьсодержащими отходами. Ртуть - вещество первого класса опасности, признана веществом, оказывающим значительное неблагоприятное неврологическое и иное воздействие на здоровье человека. В зависимости от количества ртути и длительности ее поступления в организм возможны острые и хронические отравления. Наиболее чувствительны к ртутным отравлениям женщины и дети.

6.1 Управление асбестоцементными отходами

Наиболее вероятный риск возможен при извлечении и перевозке отходов шиферного покрытия кровли и возможно асбестоцементных труб или их частей, которые будут переданы Подрядчиком для их дальнейшей утилизации. Персонал, который будет вовлечен в утилизацию АСМ, будет подвержен риску воздействия асбеста.

Руководящие принципы Всемирного Банка по обращению с асбестом и асбестосодержащими материалами заявляют, что ремонт или удаление и утилизация асбестосодержащих материалов должны выполняться только специально обученным персоналом.

Требования по соблюдению безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами

Когда на участке проекта присутствует асбест, он должен быть четко обозначен как опасный материал. Асбестосодержащие материалы не должны подвергаться резке или нарушениям, так как это приведет к пылеобразованию. Во время реконструкции все работники должны избегать дробления / повреждения отходов, содержащих асбест, складировать такие отходы в специально отведенных местах в пределах строительной площадки, и утилизировать их должным образом в специальном месте или в местах захоронения. Если асбестосодержащие отходы подлежат временному хранению на объекте, они должны надлежащим образом содержаться в герметичных контейнерах, и соответствующим образом быть промаркированы как опасный материал. Меры предосторожности должны быть предприняты для предотвращения любого несанкционированного удаления таких отходов с участка.

Все асбестосодержащие материалы должны быть обработаны и утилизированы только квалифицированным и опытным персоналом. Персонал должен носить соответствующие средства индивидуальной защиты (маски, защитные перчатки и спецодежду). При обращении с отходами асбеста, работники должны обязательно носить специальную защитную одежду, перчатки и респираторы. Перед удалением (при необходимости) асбеста с участка, он должен быть обработан смачивающим агентом, чтобы минимизировать выброс асбестовой пыли. Удаленный асбест никогда не должен повторно использоваться.

В зоне ведения работ запрещено нахождение людей, непосредственно не связанных с выполнением работ.

Все работающие в производстве и применении асбеста должны быть информированы об опасных свойствах асбеста для здоровья.

Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: респираторами, касками, очками, защитной обувью.

При погрузочно-разгрузочных работах со старой кровлей (шифером), не допускать использование крюков и других острых приспособлений, чтобы не разрушить кровельные листы.

Не допускать сброса кровельных листов с какой-либо высоты при демонтаже кровли и погрузочно-разгрузочных работах.

В случае разрушения кровельных листов при ведении работ, необходимо проводить увлажнение образующихся отходов в целях предотвращения образования пыли.

Мелкие асбестоцементные отходы собрать в контейнер и хранить в закрытом виде до вывоза из стройплощадки.

Транспортировка асбестоцементных материалов к месту их утилизации или хранения в автотранспорте должна осуществляться, исключая их падение и повреждение;

В случае падения и разрушения асбестосодержащих материалов по пути их следования к месту утилизации или хранения, необходимо очистить территорию от частей и вывезти к месту утилизации или хранения.

После разгрузки на полигоне, асбестосодержащие отходы необходимо закрыть сверху слоем земли не менее 2м.

7. ОБЪЕМ И ЦЕЛИ ПУОСС

ПУОСС считается обязательным документом, который необходимо соблюдать в ходе реализации микропроекта. ПУОСС состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. План управления окружающей и социальной средой описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате строительства спортивного зала, включая вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и строительных отходов.

АРИС наряду с ОМСУ несет ответственность за мониторинг соответствия всех финансируемых в рамках микропроекта мероприятий с мерами охранной политики Всемирного банка в экологической и социальной

сферах, действующих в отношении ПСИ-3, а также с требованиями национального законодательства КР. Экологический мониторинг работ (см. таблицу 9) будет проводиться согласно ПУОСС, описанному в настоящем документе. Экологический и социальный мониторинг предполагает регулярный осмотр участков проведения всех физических мероприятий по микропроекту, финансируемых подрядчиками микропроекта, и отслеживание реализации ПУОСС.

Подрядчики микропроекта обязаны соблюдать ПУОСС. Строительный подрядчик должен располагать специальным персоналом, ответственным за реализацию ПУОСС на этапе ремонтных работ. Специалист АРИС на местах будет отслеживать выполнение мер по смягчению воздействий и соблюдению добросовестной практики, предписанной данным документом, и в случае выявления недостатков уведомит подрядчиков о выявленных проблемах и потребует принять корректирующие меры. ПУОСС будет включен в тендерную документацию на выполнение работ, и таким образом, подрядчики будут обязаны соблюдать требования ПУОСС.

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта Ак-Чий села Эпкин АА Чолпон Кочкорского района Нарынской области»

Экологические и социальные компоненты	Воздействия	Предлагаемые меры по снижению воздействий ¹	Институциональная ответственность за минимизацию воздействий	Стоимость мер по смягчению воздействия ²
Период строительства 3 месяца				
Физическая среда				
Почва	Строительный мусор	-Сортировка всех видов отходов, повторное использование и переработка, при возможности. -Утилизация отходов, которые не могут быть повторно использованы либо переработаны; вывоз и утилизация отходов на отдельные отвалы и в сотрудничестве с местной компанией по утилизации отходов; запрет на открытое сжигание мусора. -Минеральные отходы от строительства и демонтажных работ должны быть отделены от общих и органических отходов, жидкие и химические отходы должны сортироваться и храниться в специальных контейнерах.	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов

¹Мероприятия, требующие финансовых затрат, должны быть предусмотрены в ВОР,

² Стоимость работ по смягчению воздействий определяется подрядчиком в тендерных документах за те позиции, которые являются сферой его ответственности.

		-Все документы по вывозу и утилизации отходов должны вестись соответствующим образом в качестве доказательства надлежащей утилизации мусора на площадке. -Образующиеся строительные и бытовые отходы, будут утилизироваться в специально отведенные муниципальными органами управления места, которые могут быть использоваться повторно, будут сданы на переработку (металлолом, деревянные отходы, др.); -Установка контейнеров для сбора ТБО на территории школы; -Установка биотуалета для работающих; -ТБО и строительные отходы сжигаться не будут на строительных площадках;		
Водные ресурсы	Загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, строительными отходами	-Использование лишь отдельно отведенного участка. -Применение базовых надлежащих норм строительства и стандарты, применяемые во время строительства. -Ежедневные проверки техники на наличие утечек масла; запрет на мытье машин на строительной площадке и возле открытых водных объектов.	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов

		-Запрет на засорение бытовыми и строительными отходами траншей.		
Качество воздуха	Пыль во время строительства Низкое качество внутреннего воздуха Запахи	Борьба против пыли путем смывания водой или другими средствами; соответствующее хранение отделочных материалов, вентиляция помещения; соответствующее планирование, размещение и удаление отходов	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Опасные отходы	Асбестосодержащие отходы	-проведение инструктажа по демонтажу асбеста -выполнение работ обученным персоналом -запрет на дробление и разрушение шифера -утилизация отходов	Подрядчик несет ответственность за выполнение. Согласование с АО место утилизации отходов. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию.
Биологическая среда				
Фауна и флора	Санитарная рубка деревьев	-получение разрешения у АО о рубке или подрезке деревьев	Подрядчик несет ответственность за выполнение. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	
Социальная среда				
Эстетика и ландшафт	Образование насыпей	-очистка территории от грунта	Подрядчик несет ответственность за выполнение.	

		-вывоз лишнего грунта на участки согласованные с АО	Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	
Сообщества	Жалобы общественности	-размещение информационных баннеров в местах строительства	Подрядчик несет ответственность за выполнение. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
	Приток рабочей силы	-Найм работников, проживающих на участке производства работ (по возможности); -Заключение трудовых договоров с работниками	Подрядчик несет ответственность. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Культурное наследие	Обнаружение артефактов	-Приостановка земляных работ, извещение МСУ. До получения разрешения на продолжение работ	Подрядчик, ОМСУ, технадзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Безопасность, здоровье персонала и населения	Травмы и несчастные случаи на участке производства работ,	-Соблюдение СН КР 12-01:2018 безопасность труда в строительстве;	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по охране труда и техники безопасности..	Без дополнительных затрат: общая ответственность

	при эксплуатации инструментов	-Оснащение сварщиков защитным оборудованием, резиновыми перчатками, специальными ботинками и шлемами; -проведение инструктажа до начала сварочных работ; -Строгое соблюдение правил использования защитного снаряжения, которые, как минимум, включает в себя: (а) респиратор / сварочные защитные маски; (b) защитную одежду: вся поверхность кожи должна быть защищена от попадания расплавленного металла и искр. Защитная одежда включает: рубашки с длинным рукавом; брюки, которые покрывают верхние части обуви; перчатки; ботинки или сапоги; (с) устройства для защиты глаз от мусора и от воздействия ультрафиолетового излучения; (d) шлемы; -Строгое соблюдение требований пожарной безопасности: наличие средств пожаротушения на участке работ. -наличие списка и номера телефонов близлежащих экстренных служб.	Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор. Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор. Государственный уполномоченный орган.	подрядчика по выполнению работ
Период эксплуатации				
Физическая среда				

<i>Почва</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Водные ресурсы</i>	<i>Нарушение целостности выгребной ямы</i>	Регулярное профилактическое обслуживание. Очистка септика и вывоз на очистные сооружения	Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Качество воздуха</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
Биологическая среда				
<i>Флора и фауна</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
Социальная среда				
<i>Эстетика и ландшафт</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Культурное наследие</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Безопасность, здоровье персонала и населения</i>	Нарушение эксплуатационного режима	Регулярное профилактическое обслуживание	Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	

9. План мониторинга мероприятий

Этап реализации подпроектов	Какой параметр подлежит мониторингу	Где будет осуществляться мониторинг?	Как будет осуществляться мониторинг? /тип оборудования для мониторинга	Когда? (частота измерений)	Стоимость мониторинга ¹³ (стоимость оборудования или сумма расходов подрядчика, необходимая для осуществления мониторинга?)	Институциональная ответственность за мониторинг	Дата начала
Строительство	Шум Воздух Транспорт Утилизация и хранение отходов Загрязнение почвы и воды	На строительной площадке и отвале На и возле строительной площадки На строительной площадке и отвале	Портативные шумомеры Портативные приборы для измерения Визуально Согласно плану и обзору. Визуально И приборами для измерения	При жалобах населения Постоянно Согласно плану, но минимум еженедельно	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов	1.Инспекция строительной площадки осуществляется со стороны АРИС для обеспечения соответствия с ПУОСС. 2. Государственные инспекторы Департамента архитектурно-строительного надзора (ДАСН) будут проводить надзор за выполнением проектных решений в ходе строительных и установочных работ либо в ходе реконструкции объектов, за качеством строительных материалов, сооружений. Они будут участвовать при сдаче в эксплуатацию завершенных объектов строительства. 3. ГЭТИ (Госэкотехинспекция), осуществляющий государственный экологический надзор, имеет право на надзор в	После передачи объекта Подрядчику.

	Демонтаж строительн ой площадки	На строительной площадке	Визуально	Согласно плану		установленном порядке после предоставления соответствующих идентификационных документов согласно экологическим положениям, нормативам, мероприятиям по охране окружающей среды в ходе реализации проекта	
	Безопаснос ть рабочих	На строительной площадке	Визуально	Постоянно			

10. ИНФОРМАЦИЯ О МОС И МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

По всем вопросам относительно реализации ПСИ-3 любые заинтересованные лица проекта могут обратиться в МОС АРИС и имеют следующие права:

- Право на получение информации;
- Право на противодействие нецелесообразному вмешательству со стороны третьих лиц;
- Право на участие в тендерном процессе без случаев мошенничества и коррупции.

Любое заинтересованное лицо проекта ПСИ-3 (включая жителей села, подрядчиков, сотрудников проекта, органов власти и других вовлеченных сторон) могут подать жалобу, если он/она считает, что одно или несколько из выше представленных прав, либо какой-либо из проектных принципов или процедур было нарушено.

Жалобы подлежат публичному разглашению, но личность лица, подающего жалобу, остается конфиденциальной, только если лицо не решит раскрыть свою личность. Личность всех, подающих жалобы, обеспечивается конфиденциальностью.

Механизм рассмотрения жалоб

Регистрация обращения. *Обращения, полученные в письменном, устном или электронном виде,* регистрируются в журнале МОС, а затем вносятся в конфигурацию МОС для анализа и мониторинга входящей корреспонденции, содержащей следующую информацию (в зависимости от вида обращения):

- Фамилия, имя, отчество;
- Адрес регистрации и проживания или номер телефона;
- Содержание обращения;
- Другая справочная информация.

Обращения могут быть поданы анонимно. В случае, если обращения поступило при отсутствии каких-либо вышеперечисленных данных, оно фиксируется в журнале входящей корреспонденции МОС, а результаты обращения будут опубликованы в СМИ на местном уровне, на сайте АРИС либо обнародованы на сессии Айыльных Кенешей.

Контроль исполнения. После завершения расследования, бенефициар получит уведомление о решении, принятом АРИС по его делу. В случае, если гражданин/бенефициар не удовлетворен решением, полученным по результатам рассмотрения обращения, он имеет право на апелляцию. Инструкции по подаче апелляции будут предоставлены вместе с ответом.

Апелляция. Апелляция рассматривается специальным Комитетом АРИС по рассмотрению обращений. Исполнительный директор АРИС сформирует Комитет по рассмотрению обращений из руководителей проектов и руководителей отделов, которые будут проводить слушание апелляций. После апелляционного рассмотрения обращения, гражданин/бенефициар неудовлетворенный решением Комитета, имеет право на обжалование решения в судебном порядке.

Публикация обращений. После того, как обращение (заявления, предложения, жалобы, запросы, позитивные отзывы) разрешено, для поощрения использования МОС, меры, предпринятые для ее разрешения, будут опубликованы в средствах массовой информации на местном уровне. По желанию личность заявителя будет сохранена в тайне.

Каналы обратной связи. В рамках ПСИ-3 АРИС установлены следующие каналы связи, посредством которых жители/бенефициары могут направить обращения на разных этапах реализации проекта:

- a. WhatsApp (система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных устройств с поддержкой голосовой и видеосвязи – номера МОС + 996 550 700 522; +996 770 700 522);
- b. Социальные сети (Фейсбук – Официальная страница «Агентства развития и инвестирования сообществ»);
- c. Веб-сайт АРИС: www.aris.kg;
- d. Устные или письменные обращения, полученные в ходе рабочих встреч на местах, фасилитаторов, молодежных кураторов и/или ЭПРО;
- e. Входящая корреспонденция вручно в приемную АРИС;

Входящая корреспонденция по электронной почте bfm@aris.kg.

11. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Коомдук угуунун протоколу

Нарын облусунун Кочкор районундагы Чолпон айыл аймагы АРИС АИД-3

ПРОТОКОЛ

«29» июль 2019-жыл

Эпкин айылы

Катышуучулардын саны: 19 адам
Чогулуштун трагасы: Дуйшенбек уулу Максат
Чогулуштун катчысы: Акматова Ж

Күн тартиби:

1. АРИСтин АИД-3 аркылуу каржылана турган «Эпкин айылындагы Ак-Чий ФАПнын ремонттоо» чакан долбоорунун айлана чөйрөнү башкаруу планын презентациялоо
2. Суроо-жооптор

Угулду:

Чогулушту Чолпон АА өкүлү Дуйшенбек уулу Максат ачып, долбоор жөнүндө төмөнкүлөрдү билдирди:

Саламатсыздарбы урматтуу чогулуштун катышуучулары, Эпкин айылынын тургундары. Өзүңүздөр билгендей, 2018-жылы старт алган АРИСтин АИД-3 долбооруна катышып, ОККнын жыйынтыгы менен Ак-Чий ФАПынын капиталдык ремонттоо чакан долбоорун утуп алганбыз. Азыркы учурда баардык техникалык документтери жана тендердик документтери даярдалып, тендер жарыяланганы турат. Тендер аркылуу подрядчыны тандап алсак, эки айдын ичинде долбоор боюнча имараттын сырты пайдубалы менен кошо жылууланып, шыбалып, ичине суу киргизилип, косметикалык ремонттоон өткөрүлүп, чатыры жылууланып, алматырылат. Мындан тышкары айланысы тозулуп, көркөндүрүлөт. Эгерде кандайдыр бир тоскоолдуктардын негизинде же ретендерге жарыялангандыгына байланыштуу долбоордун аткарылышы кечендесе, курулуш мезгилинде бүтпөй калуу коркунучу бар. Бул учурда кандай чара көрө тургандыгыбызды силер менен сүйлөшүп алсак деп чечтик.

Ж.Акматова-Ак-Чий ФАПынын башчысы: Өзүңүздөр билгендей биздин айылда эки ФАП бар. Бири Ак-Чий ФАПы, экинчиси 5 км аралыкта турган Эпкин ФАПы. Куралуш иштери жүрүп жаткан учурда кабыл алуу Эпкин ФАПында жүргүзүлөт. Ал эми керек учурда мен өзүм Ак-Чий ФАПы тейлеген калкты жеринде кыдырып, медициналык кароодон өткөрүп турам.

К.Асанов АРИС эксперти: чакан долбоорду ишке ашыруу учурундагы социалдык чөйрөнү жана айлана —чөйрөнү башкаруу планы боюнча кыскача маалымат берди. Маалымат берүү учурунда төмөндөгү суроолор талкууга алынды:

- КР жаратылышты коргоо мыйзамынын жана донорлордун айлана чөйрөнү коргоо талаптары;
- Айлана чөйрөнү башкаруу планы;
- Чакан долбоорду ишке ашыруу учурундагы таасир тийгизүүчү айлана чөйрөнүн компоненттери;
- АЧБП жумшартуу чаралары.

Маалыматтын соңунда төмөндөгүдөй суроолор берилди:

Эпкин айылынын тургуну Ж.Исмаилов: Бул имараттын курулуш иштери жүрүп жаткан учурда кандай материалдар колдонулат жана сапатуу бүтүрүүгө кепилдик барбы?

Жооп: К.Асанов: Курулуш иштери АРИС тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынат жана сапатсыз материалдарды колдонууга же иштерди сапатсыз бүтүрүүгө жол бербөөгө бардык аракеттер көрүлөт.

Эгерде начар болсо биз кабыл албай коюуга укугубуз бар. Сиздер дагы өзүңүздөр келип көрүп турсанар болот.

Эпкин айылынын тургуну А.Молдоңасилов: Бул иштерди биздин балдар өздөрү бүтүрүшсө болмок. Ансыз деле бош жүрүшөт.

Жооп: К.Асанов: Курулуш иштери сапатуу бүтүрүүнүн кепилдиги болуш үчүн жумуштарды тажрыйбасы бар курулуш мекемеси жүргүзүүсү шарт. Мындан тышкары акча каражаты Кыргызстандагы өкүм сүргөн мыйзамдардын жана донорлордун талаптарынын чегинде гана которулат. Башкача айтканда, иштер мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү, курулуш чөйрөсүндөгү мыйзамдардын чегинде гана жүргүзүлөт.

Жогорудагы маселени угуп жана талкуулап, жалпы жыйналыш

ЧЕЧТИ:

1. АРИСтин АИД-3 аркылуу каржылана турган «Эпкин айлындагы Ак-Чий ФАПынын ремонттоо» чакан долбоорунун айлана чөйрөнү башкаруу планы колдоого алынсын.
2. Долбоорду ишке ашыруу учурунда айлана чөйрөнү башкаруу планы аткарылсын.

Чогулуштун торагасы:

Чогулуштун катчысы:



Дуйшенбек у М

Ж. Акматова

11.1. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Протокол

Общественных консультаций по обсуждению Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) капитального ремонта ФАП Ак-Чий села Эпкин АА Чолпон Кочкорского района

с. Эпкин новостройка Ак-Чий

29 июля 2019 г.

Цель: Ознакомление заинтересованных сторон с мерами экологической и социальной безопасности.

Место и время проведения: здание ФАП Ак-Чий

Присутствовало: 19 человек

Общественные консультации открыл представитель АА Чолпон М.Дуйшенбек уулу

Затем, эксперт поддержки районных общин (ЭПРО) К.Асанов вкратце рассказал о проекте ПСИ-3 и выступил с презентацией Плана Управления окружающей и социальной средой.

В выступлении кратко были освещены вопросы:

- Требования Операционной политики Всемирного Банка ОР 4.01 по экологической оценке;
- Требования природоохранного законодательства Кыргызской Республики;
- Содержание ПУОСС;
- Компоненты окружающей среды, которые могут быть подвержены воздействию в ходе реализации проекта;
- Меры смягчения, предложенные в ПУОСС
- Информация о Механизме обратной связи.

Также заведующая ФАП Ж.Акматова проинформировала собравшихся о мерах которые будут предприняты для охвата жителей медицинской помощью на время капитального ремонта ФАП.

Представитель АА Чолпон М.Дуйшенбек уулу вкратце рассказал жителям села о сроках и объёме работ.

Были заданы следующие вопросы:

Вопрос: Ж.Исмаилов – какие материалы будут применяться во время работ и если гарантии что работы будут качественные?

Ответ : К. Асанов- работы будут вестись строго согласно строительным нормам КР и требованиям доноров и находится по постоянным контролем инженеров АРИС.

Вопрос: А. Молдонасиров- а если работу будут делать местные жители, ведь они и так свободны?

Ответ : К.Асанов- работы должны выполняться квалифицированными работниками с соблюдением норм и правил согласно строительным нормам КР и требованиям доноров.

Заслушав и обсудив предоставленную информацию собрание жителей

РЕШИЛО:

Одобрить План управления окружающей и социальной средой капитального ремонта ФАП Ак-Чий села Эпкин АА Чолпон Кочкорского района т.к. он является достаточным, охватывает все компоненты окружающей и социальной среды и приемлем для реализации.

Торага собрания

М.Дуйшенбек уулу

Секретарь

Ж.Акматова

12. СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЛУШАНИЙ

Үчүнчү айылды инвестициялоо долбоору (АИД-3)
 АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ БАШКАРУУ ПЛАНЫН ТАЛКУУЛОО КООМДУК УГУУНУ
 КАТТОО БАРАКЧАСЫ

#	ААА	Эркек/аял	Кызматорду	Телефон	Кошу
1.	Исмаилов И	Эрк	коомдук	070	Исмаилов
2.	Тамбошев К	Эрк	коомдук		
3.	Бекмуров В	Аял	Бекмуров	070	Бекмуров
4.	Бакасова Б	Аял	Бекмуров	070	Бакасова
5.	Шерашева	Аял	Бекмуров	070	Шерашева
6.	Абдымому	Аял	Бекмуров	070	Абдымому
7.	Караматов И	Аял	Бекмуров	070	Караматов
8.	Курманбек И	Аял	Бекмуров	070	Курманбек
9.	Аманжол	Аял	Бекмуров	070	Аманжол
10.	Мурзакметов А	Аял	Бекмуров	070	Мурзакметов
11.	Чымышева М	Аял	Бекмуров	070	Чымышева
12.	Абдымому	Аял	Бекмуров	070	Абдымому
13.	Байман у. А	Эрк	Бекмуров	070	Байман
14.	Абдымому	Эрк	Бекмуров	070	Абдымому
15.	Аманжол у. А	Эрк	Бекмуров	070	Аманжол
16.	Аманжол у. А	Эрк	Бекмуров	070	Аманжол
17.	Аманжол у. А	Эрк	Бекмуров	070	Аманжол
18.	Аманжол у. А	Эрк	Бекмуров	070	Аманжол
19.	Аманжол у. А	Эрк	Бекмуров	070	Аманжол
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

13. ФОТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ



14. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ МИКРОПРОЕКТА

Чеклист по скринингу для оценки социальных рисков и воздействий от под-проектных мероприятий

Название подпроекта/микропроекта Капитальный ремонт здания ФАП Ак-Чиб с. Экке
 Область Наранская
 Район Когорский
 Айылный аймак Чолпонский
 Айыл Экке

Возможные Социальные Воздействия	Да	Нет	Предоставить детали/кол-во, если возможно
1. Будут ли проектные мероприятия включать новые физические строительные работы?		✓	
2. Включают ли мероприятия улучшения или реабилитацию существующих объектов?	✓		
3. Вероятно ли, что мероприятия вызовут неоправимый ущерб или утрату домовладений, других активов, использования ресурсов?		✓	
4. Выбранный участок для работы свободен от обременений и находится во владении Общественности/правительства/сообщества?	✓		
5. Требуют ли под-проектные мероприятия приобретения частных земель?		✓	
6. Если участок находится на частной территории, может ли эта земля быть приобретена путем переговоров (по обоюдному согласию)?			не требуется
7. Если требуется приобрести земельный участок, известен ли размер участка и каков статус права собственности?			не требуется
8. Приводят ли мероприятия под-проекта к ограничению доступа к другим жителям/пешеходам/коммерческой деятельности и торговле?		✓	
9. Доступна ли земля для мобилизации и транспортировки строительных материалов в пределах существующего участка/имеется ли право проезда?	✓		
10. Проживают ли/занимаются ли предпринимательской деятельностью non-titled люди на предлагаемой территории/проектном участке под строительство?		✓	
11. Вероятны ли временные воздействия?	✓		временное размещение сотр. ФАП
12. Имеется ли возможность переноса, закрытия предпринимательской/коммерческой/хозяйственной деятельности лиц во время строительства?			не требуется
13. Имеются ли временное или постоянное физическое перемещение лиц в связи со строительством?	✓		сотрудники ФАП
14. Включает ли этот проект переселение каких-либо лиц? Если да, предоставьте детали.		✓	
15. Будет ли потеря/ущерб сельскохозяйственным землям, несобранному урожаю, деревьями?		✓	

16. Будет ли потеря доходов и средств существования для кого-либо в связи с проектными мероприятиями?	✓	
17. Будет ли для людей потеря доступа к объектам, услугам или природным ресурсам постоянным или временным?	✓	
18. Приведет ли проект к потере трудоустройства/работы?	✓	
19. Вызовет ли проект чрезмерный приток рабочей силы в результате строительства	✓	
20. Требуют ли строительные мероприятия дополнительной/квалифицированной рабочей силы извне	✓	
21. Вызовут ли под-проектные/строительные мероприятия разрушения/беспорядки среди местного проживающего населения	✓	
22. Создадут ли строительство новых зданий, дренажный канал, линии электропередач износ/повреждение общественных зданий/ресурсов/прилегающих домов, колодец, земель, мест захоронений, детских парков, школ и т.д.	✓	
23. Приведут ли проектные мероприятия к снижению рабочей силы (сокращению рабочих штатов) какого-либо органа	✓	
24. Приведут ли проектные мероприятия к непреднамеренным последствиям, таким как несчастные случаи/разрушения прилегающих зданий	✓	
25. Имеются ли уязвимые группы, которые могут быть повергнуты негативным воздействиям (включая коренные группы населения) в результате проектных мероприятий?	✓	

Каждое баг
