

ГODOVOЙ ОТЧЕТ



Бишкек 2022

Оглавление



Стр

Введение.....

.....

Компонент

№1.....

Компонент

№2.....

Компонент

№ 3.....

Компонент

№4.....

Компонент

№5.....

Приложения.....

.....

Введение

Цель проекта: оказание поддержки Правительству Кыргызской Республики (ПКР) в усилении регионального экономического развития путем целенаправленных вмешательств в выбранных секторах в Ошской области и г. Ош.

Проектом охвачены все села, айыльные аймаки, малые города, районы Ошской области и город Ош.

- В сфере сельского хозяйства: все 7 районов Ошской области
- В сфере туризма: города Ош и Узген
- В программе малых грантов: все 7 районов Ошской области
-

Общая стоимость проекта составляет – 60 млн. долл. США. (30 млн. долл. США - кредит; 30 млн. долл. США - грант)

Срок реализации – 2021-2026 гг. (5 лет).

Компоненты проекта

Проект состоит из следующих компонентов:

Компонент №1

Компонент 1: Улучшение регионального экономического планирования и регулятивных функций (5 500 000,0 долларов США)

Мероприятия, предлагаемые в рамках этого компонента, направлены на создание потенциала для планирования регионального экономического развития на республиканском и региональном уровнях и предоставление возможности соответствующим учреждениям соответствующих министерств и других ведомств в Ошской области выполнять свои полномочия по предоставлению ключевых государственных услуг, в том числе эффективное регулирование. Этот компонент будет состоять из двух подкомпонентов:

Компонент №1.1.

Подкомпонент 1.1: Улучшение регионального экономического планирования (1 500 000,0 долларов США)

В рамках данного подкомпонента проект окажет поддержку в разработке и реализации Плана регионального экономического развития. План будет разработан региональными органами власти и будет направлен на выявление возможностей для повышения

регионального экономического потенциала за счет инклюзивных, комплексных и климатически обоснованных инициатив.

Подкомпонент также будет поддерживать устойчивой координации между национальным и региональным уровнями используя технологии и практики (например, информационная система/цифровая платформа для определения приоритетов и отбора инвестиций в региональное развитие).

Компонент №1.2.

Подкомпонент 1.2: Улучшение основных сельскохозяйственных услуг и регулятивных функций (4 000 000,0 долларов США)

Этот подкомпонент будет направлен на улучшение инфраструктуры и услуг, которые лежат в основе агропродовольственного маркетинга и торговли в Ошской области, с акцентом на укрепление потенциала для санитарного и фитосанитарного (СФС) контроля, качества продуктов питания и базовых услуг.

Это будет включать в себя финансирование модернизации лабораторного оборудования в пунктах пограничного контроля и обновление возможностей отбора проб на районном / местном уровне. Инвестиции также будут финансировать модернизацию инфраструктуры качества безопасности пищевых продуктов в городе Ош/Ошской области в рамках Госстандарта, Пищевой лаборатории (Санэпиднадзор), Ветеринарной службы и небольших лабораторий по безопасности пищевых продуктов на местных рынках. Будет также оказана поддержка в обновлении функций сертификации семян и анализа почвы в Оше с целью поддержки инвестиций в компоненте 2. Компонент также обеспечит целевые инвестиции для Ошского технологического университета и Ошского сельскохозяйственного техникума по обновлению их учебных возможностей и оборудования в соответствии с требованиями экспортных рынков сельскохозяйственной продукции, правил безопасности пищевых продуктов, НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР) и современными технологиями переработки пищевых продуктов для краткосрочного и долгосрочного обучения.

Компонент №2.

Компонент 2: Укрепление агропродовольственных цепочек поставок товаров и мелкими сельскохозяйственными производителями (МСП) (25 500 000,0 долларов США)

Этот компонент будет способствовать развитию партнерских отношений между агропредприятиями и мелкими сельскохозяйственными предприятиями и малыми

сельскохозяйственными производителями для финансирования целевых инвестиций подпроектов, которые улучшат качество и увеличат объемы производства / переработки. Данный компонент сосредоточен на инвестициях в развитие частного сектора, направленных на укрепление цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве.

Цели компонента:

- 1. Улучшение доступа к рынкам и повышение качества продукции;*
- 2. Развитие партнерских отношений между представителями агробизнеса, построение цепочек добавленной стоимости;*
- 3. Расширение рыночных возможностей;*
- 4. Предоставление технической помощи и обучение участников ПП*
- 5. Внедрение инновационных технологий;*
- 6. Создание и развитие необходимых производственных активов для сельскохозяйственного производства и/или послеуборочной деятельности*

Для реализации данного компонента подготовлено Руководство по продуктивному партнерству, которое утверждено Министерством сельского хозяйства КР.

Участниками ЦДС могут быть сельскохозяйственные производители, сельскохозяйственные компании (СКХ), фермерские хозяйства (ФХ), семеноводческие и племенные хозяйства, переработчики, торгово-логистические центры (ТЛС), поставщики по предоставлению сельскохозяйственных товаров и услуг.

Размеры предоставления инвестиций для получателей:

- сельскохозяйственного производителя - товары на сумму до 2 млн. сом выдается под 1,5% годовых сроком от 5 до 7 лет. Льготные период 1 год. Кроме того, сельскохозяйственный производитель должен вносить собственный вклад, который может включать затраты на рабочую силу, любые затраты, связанные с транспортировкой/доставкой сельскохозяйственных товаров.

- СКХ, ФХ, семеноводческие и племенные хозяйства - товары на сумму до 20 млн. сом выдается под 1,5% годовых сроком от 5 до 7 лет. Льготные период 1 год. Участники ПП должны внести собственный вклад, который может включать затраты на рабочую силу, любые затраты, связанные с транспортировкой/доставкой сельскохозяйственных товаров, продаж;

- переработчики, ТЛЦ - товары на сумму до 35 млн. сом выдается под 2% годовых сроком до 7 лет. Льготные период 1 год;

- местные самоуправления (АО) – максимальная сумма составит 2 млн. 200 тысяч сом на один орган местного самоуправления, местное сообщество, муниципальное или государственное учреждение. Данный вид финансирования выдается на грантовой основе.

Компонент №3.

Компонент 3: Катализирующие инвестиции для туризма и городского развития (22 000 000,0 долларов США)

Туристический сектор Кыргызской Республики все еще находится на ранней стадии развития и требует стратегических вмешательств, и для его укрепления необходимы своевременные инвестиции, а также для его развития в долгосрочной перспективе. Данный компонент позволит использовать уникальные природные и культурные активы Ошской области и его городов и финансировать основополагающие и стимулирующие инвестиции, поддерживающие: (i) комплексные пакеты улучшений приоритетных туристических объектов и кластеров; (ii) региональную инфраструктуру, услуги и удобства для устранения основных узких мест или улучшения качества и условий туризма; (iii) городские удобства, которые повысят жизнеспособность городских центров для привлечения туристов и сокращения миграции, а также (iv) пилотное государственно-частное сотрудничество для привлечения частных инвестиций в сектор туризма.

Компонент №3.1.

Подкомпонент 3.1 Обновление Ошского и Узгенского городских центров и туристических маршрутов Ошской области (19 000 000,0 долларов США)

Данный компонент направлен на инфраструктурные проекты, которые будут объектами привлечения внешних и внутренних туристов:

- обновление Ошского и Узгенского городских центров и маршрутов туризма, инвестиции в инфраструктуру в городах Ош и Узген;
- модернизацию историко-археологического музейного комплекса Сулайман-Тоо; Узгенского историко-культурного и архитектурно-археологического комплекса и их территории;
- улучшение инфраструктуры и управление парками Кара-Шоро и Кыргыз-Ата, водопада Абшыр-Ата;
- предоставление туристических услуг и удобств вдоль основных трасс (rest points).

В рамках проекта также будем инициировать и поддерживать механизм государственно-частного сотрудничества (ГЧС), который будет финансировать государственную инфраструктуру для привлечения частных инвестиций в туризм в городах и селах по всему региону, куда предприятия частного сектора готовы вкладывать средства, но для этого требуются дополнительная государственная инфраструктура, чтобы сделать их инвестиции жизнеспособными (например, общественная инфраструктура в

непосредственной близости от инвестиций, такие как дороги / тротуары, водоснабжение / канализация и т. д.).

Компонент №3.2.

3.2. Разработка, маркетинг и продвижение туристических продуктов

Данный подкомпонент включает в себя следующие пункты как разработка Стратегических документов по развитию туристического сектора в Ошской области. Кроме того, также предусмотрены следующие ключевые мероприятия:

- разработка бренд платформы территории с привязкой к разработанным туристическим продуктам;
- участие на международных туристических выставках, ярмарках, роуд шоу для продвижения брендированных турпродуктов Ошской области;
- участие в культурных и туристических мероприятиях, проводимых на территории Кыргызской Республики;
- проведение работы с мировыми каналами для продвижения туристического бренда. Разработка и издание туристических материалов: видеоматериалы о приоритетных турпродуктах Ошской области.

Компонент №4.

Компонент 4: Поддержка туризма и развития сельского предпринимательства через малые гранты (3 000 000,0 долларов США)

Проект поддержит развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) через программу (далее – Программа) обучения, предназначенную для туризма и МСП и стартапов. Программа будет направлена на поддержку запуска новых предприятий в сельской и городской местности, а также на диверсификацию и расширение туристических услуг. В туризме ожидается, что Программа улучшит потенциал, а также качество и спектр предлагаемых услуг, что может привести к взаимосвязанным, в частности, в области гастрономического туризма и экологического, агро, этно туризма.

Компонент №5.

Компонент 5: Поддержка реализации, мониторинг и оценка (4 000 000 долларов США)

Этот компонент будет поддерживать реализацию проекта, в том числе систему мониторинга и оценки проекта, коммуникационную стратегию, применение экологических и социальных защитных мер, ежегодные аудиторские проверки, обучение и

финансирование дополнительных эксплуатационных расходов АРИС и ресурсы для подготовки будущих проектов.

Ожидаемые результаты и ключевые индикаторы проекта:

- Увеличение продаж сельскохозяйственной продукции со стороны бенефициаров проекта (10 процентов);
- Увеличение количества туристов, прибывающих на объекты, поддерживаемые в рамках проекта (30 процентов)
- Увеличение числа людей, обеспеченных улучшенными городскими условиями жизни (150 тыс. чел);
- Будут созданы 25 цепочек добавленной стоимости;
- 5 000 фермеров будут внедрять усовершенствованные сельскохозяйственные технологии;
- Будут разработаны 5 планов устойчивого управления;
- Будут закуплены лабораторные оборудования для 7 пунктов отбора проб, пограничного контроля и другие.

Механизм реализации:

- Министерство экономики и коммерции КР будет координирующим государственным органом проекта в целом, включая рассмотрение годовых планов работы, составляемых Агентством развития и инвестирования сообществ КР и осуществление технических вкладов.
- Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР будет ответственно за: установление приоритетов и задач для сельскохозяйственной деятельности в рамках Проекта; определение и одобрение мероприятий в рамках частей 1.2 и 2 Проекта; и участие в отборе, оценке и мониторинге целевых инвестиционных подпроектов в рамках части 2 Проекта.
- Министерство культуры, информации и туризма КР будет нести ответственность за определение приоритетов и одобрение планов мероприятий по развитию туризма, в рамках Проекта
- Агентство по развитию и инвестирования сообществ (АРИС) будет ответственным агентством по реализацию Проекта, за организацию управления проектом и за все фидуциарные функции.
- Центр конкурентоспособности агробизнеса будет оказывать техническую поддержку в реализации подкомпонента 1.2 и компонента 2.

Статус реализации проекта

Статус реализации проекта на конец 2022 года

Компонент 1:

Подкомпонент 1.1.

В рамках Проекта в Ошской области заканчиваются работы по разработке Программы регионального экономического развития Ошской области и отдельно города Ош. Стратегию развития Ошской области планируются завершить 26 января 2023 года.

Разработано ТЗ по реализации цифровой платформы регионального развития для мониторинга и принятия решений по привлечению донорских и инвестиционных средств. Согласовано с Министерством финансов Кыргызской республики и Министерством цифрового развития Кыргызской республики.

Подкомпонент 1.2.

С 24 февраля по 19 марта 2022 года в г. Бишкек и г. Ош были проведены тренинги для сотрудников вовлеченных министерств и ведомств, полномочного представительства Кабинета Министров в Ошской области, органов местного самоуправления, представителей частного сектора по обеспечению пищевой безопасности, международным стандартам качества продукции (GAP, Organic, HACCP, ISO др.), по развитию ЦДС сельхозпродукции и созданию агрокластеров. По окончании тренингов были вручены сертификаты об успешном прохождении тренинга.

Технико-экономическое обоснование инвестиций в СФС и разработка технических условий на оборудование лабораторий, центров пунктов:

Консультационная компания завершила работу по разработки ТЭО инвестиций в СФС и разработка технических условий на оборудование лабораторий, центров, пунктов:

- Ошская специализированная контрольно-токсикологическая лаборатория;
- Ошский территориальный филиал Департамента органического сельского хозяйства;
- Ошский Центр по стандартизации и метрологии;
- Ошская лаборатория по карантину растений;
- Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Достук";
- Южная региональная почвенно-агрохимическая станция (ЮРПАС);
- Южный региональный Центр ветеринарной диагностики и экспертизы;
- Межрайонный центр экспертизы сельскохозяйственных культур;
- Ошский Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- Лаборатория Торгово-промышленной палаты (ТПП);
- Ошский Технологический университет;
- Ошский сельскохозяйственный техникум

Был подготовлен Итоговый отчет по ТЭО по лабораториям и Инвестиционный план по лабораториям. В настоящее время готовится техническая спецификация на приобретения оборудования на оснащение лабораторий.

Компонент 2:

Повышение потенциала сотрудников региональных государственных, муниципальных органов, представителей ассоциаций, кооперативов, частного сектора по продвижению экспорта, развитию ЦДС сельхозпродукции, обеспечению пищевой безопасности для внутренних рынков и стимулирования экспорта:

Компанией «АгроВэй» было проведено исследование и был предоставлен Отчет о комплексной оценке экономической ситуации и конкурентоспособности агробизнеса с целью построения цепочки добавленной стоимости и продуктивного партнерства в Ошской области и в г. Ош. Было проведено 33 фокус-группы, 85 глубинных интервью и было опрошено 370 человек в Ошской области. Также, была разработана Матрица размещения ЦДС по территории Ошской области, где было выявлено 14 потенциальных ЦДС.

В рамках компонента 2 с целью проведения информационной кампании и социальной мобилизации в Ошской области и г. Ош была отобрана консалтинговая компания «АгроЛид». Так, с целью повышения информированности среди населения о проекте ВБ «Региональное экономическое развитие» и определения потенциальных бенефициаров проекта в 88 айылных аймаках 7 районов Ошской области проведены информационные встречи с представителями сельскохозяйственного и агроперерабатывающего сектора. На встречах приняли участие представители Айылных аймаков, Финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов Кыргызской Республики, ЦКА, РУАР, «АгроЛид», перерабатывающих предприятий, торгово-логистических центров и производители сельскохозяйственной продукции. Участники встреч показали свою заинтересованность в проекте и отметили важность в социально-экономическом развитии Ошской области и г. Ош. Со стороны специалистов ЦКА и «АгроЛид» предоставлена общая информация о проекте, а также была продемонстрирована презентация. Заинтересованные представители сельскохозяйственного сектора во время встреч заполнили анкеты, на базе которых была разработана база данных потенциальных бенефициариев проекта. В дальнейшем, данная база данных будет использована при проведении мероприятий в рамках социальной мобилизации. Данная база данных обновляется ежедневно по мере поступления анкет со стороны бенефициаров. Анкеты заполняются в бланочном и электронном виде.

11 июня 2022 года проведена встреча с представителями консалтинговой компании «АгроЛид». Целью данного мероприятия является подведение итогов проведенных информационных встреч в первую неделю в рамках проведения информационной кампании и социальной мобилизации.

В рамках информационной кампании подготовлены буклеты, постеры, рекламные материалы, презентации и другие информационные материалы о проекте. В каждом

айыльном аймаке вывешены постеры с указанием контактных данных, в городе Ош открыт и постоянно функционирует колл центр для предоставления консультаций и получения заявок для участия в продуктивных партнёрствах.

После окончания информационных встреч сотрудники ЦКА совместно со специалистами «АгроЛид» провели ряд встреч с представителями агроперерабатывающего сектора, с целью определения агрегатора/лидера ЦДС и их потенциала и заинтересованности. Так, в рамках вышеуказанной инициативы, проведены встречи с представителями нижеуказанных предприятий:

1. «Алай-Куу Органикс»;
2. «Жети-Баатыр»;
3. Ноокат алмасы;
4. «ОсОО Обид Фаиз»;
5. «Бал Ширин».

24 июня 2022 года в региональном офисе ЦКА в г. Ош прошла встреча с представителями сельскохозяйственного и агропромышленного сектора. На данной встрече приняли участие директор ЦКА Беков Т. Н., представители компании агробизнеса и сотрудники регионального офиса ЦКА в г. Ош. Так, в рамках данной встречи, со стороны ЦКА, предоставлена информация о проекте. Представители агробизнеса рассказали о своих планах на ближайшее будущее, выразили свою заинтересованность в участии в проекте и рассказали, что реализация проекта даст возможность производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции повысить свой потенциал.

25 июня 2022 года проведена встреча с представителями предприятия «Бал Ширин». Данное предприятие занимается переработкой и реализацией консервированной плодоягодной и овощной продукции. Основными рынками сбыта являются Российская Федерация, а также местный рынок. Встреча прошла на базе цеха «Бал Ширин». Директор Беков Т. Н., а также сотрудники регионального офиса ЦКА, ознакомились с производственной линией и мощностью производства данного цеха. Также, представители «Бал Ширин» рассказали о ближайших планах, у них планируется закуп технологического оборудования для увеличения объемов производимой продукции из-за повышенного спроса на реализуемую продукцию. Новое технологическое оборудование позволит предприятию повысить качество выпускаемой продукции, увеличение в ассортименте и объема, а также увеличение производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В начале июля 2022 года компания «АгроЛид», в соответствии с Планом работ, начала проводить социальную мобилизацию с целью формирования потенциальных групп по интересам и направлениям цепочек добавленной стоимости (ЦДС).

В настоящее время завершается мобилизационная компания, в ходе которой выявлены новые потенциальные ЦДС по которым готовятся предложения о включении их в матрицу ЦДС.

Также, в начале июля 2022 года началась подготовка к проведению тендера по отбору агрегаторов для продуктивного партнерства (ПП). В последующем, перспективные агрегаторы для ЦДС будут предоставлены на рассмотрения и отбора в Комитеты по Продуктивному Партнерству. 3 августа 2022 г. было проведено первое Заседание и 8 сентября 2022 г. было проведено второе Заседание по продуктивным партнерствам, где были отобраны и подготовлены 3 заявки по которым были подготовлены проектные предложения на участие в рамках продуктивных партнерств.

С 4 по 7 октября 2022 г. были проведены тренинги на тему «Принципы построения агрокластеров и устойчивой цепочки добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе», который прошел в г. Бишкек с целью повышения потенциала персонала в области построения агрокластеров.

Компания «Агролид» занимается также сбором документов потенциальных участников ЦДС для предоставления в Финансово-Кредитный Фонд при Министерстве финансов КР для определения платежеспособности.

В ноябре 2022 года компанией «Агролид» было проведено ряд тренингов для фермеров по бизнес планированию.

11 ноября 2022 года состоялось очередное заседание по продуктивному партнерству по рассмотрению, отбору и утверждению бизнес-планов, проектных и подпроектных предложений продуктивного партнёрства по укреплению цепочек поставок товаров сельскохозяйственной продукции, а также малых и средних предприятий, где подробно были рассмотрены бизнес проекты по направлениям: ЦДС «Яблоко» (Лидер - ССКК «Ноокат алмасы»), ЦДС «Молоко» (Лидер – ОсОО «Алайку органикс»), ЦДС «Шоковая заморозка фруктов и овощей» (Лидер – ОсОО «Туран Групп).

Со стороны компании «Туран Групп» готовится ПСД и разрешительные документы для строительства торгово-логистического центра, который будет отвечать требованиям международных стандартов пищевой безопасности.

ССКК «Ноокат алмасы» имеет сад, отвечающий стандартам ЕС, используют пестициды, вошедшие в реестр, привлекают международных консультантов, которые обучают фермеров в учебном центре правильной обрезке и обработке сада.

26 декабря 2022 года было проведено очередное заседание по ПП, где были рассмотрены и утверждены следующие бизнес-планы по направлениям:

ЦДС «Птицеводство» (Лидер – ОсОО «Би Би Кей Групп», Кара-Суйский район),

ЦДС «Вяленые (сушеные) томаты» (Лидер – ОсОО «Тоок Ордо», Узгенский район),

ЦДС «Мясо» (Лидер – ОАО «Келечек», г Ош)

ЦДС «Хлопковое масло» (Лидер-ОсОО «Ак Алтын Текс», Араванский район).

Компонент 3:

Подкомпонент № 3.1.

Инфраструктурные объекты в рамках Проекта были утверждены местными органами власти и соответствующими государственными органами и одобрены Наблюдательным советом Проекта. Проведена социальная и экологическая оценка по одобренным объектам и начаты работы по подготовке ПСД для отобранных инфраструктурных объектов города Ош и Узген. Подготовлены технические задания по реконструкции музейных комплексов Сулайман-Тоо и историко-архитектурного комплекса г. Узген. В целях улучшения инфраструктуры национальных парков разработаны дизайны технических заданий для парка Кара-Шоро, Кыргыз-Ата и Абшир-Ата.

В настоящее время завершается подготовка ПСД для объектов в городах Ош и Узген. Эти работы позволят улучшить туристическую привлекательность национальных парков для местных и зарубежных туристов. Завершена подготовка технических спецификаций для запуска строительных работ на участке прибрежной зоны реки Ак-Буура.

В настоящее время завершились тендера и идет подготовка для заключения контрактов по разработке ПСД и Плану управления музейными комплексами «Сулайман-Тоо» и «Узгенский минарет».

16 ноября 2022 года был заключен контракт с Консорциумом по подготовке ТЭО и ПСД по улучшению туристической инфраструктуры национальных парков Кыргыз-Ата, Кара-Шоро и водопада Абшир-Ата.

10 августа 2022 года была нанята консультационная компания «Эко аудит» для проведения оценки системы управления твёрдыми отходами в городе Узген и определение приоритетных инвестиций в сектор». Целью консультационного задания является оказание поддержки муниципалитетам г. Узген в оценке текущего состояния системы обращения с твердыми бытовыми отходами, определение и предложение приоритетных инвестиций для решения проблем, связанных с ТБО.

Был проведен анализ институциональных механизмов и механизмов планирования в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами в каждом отобранном муниципалитете, анализ уровня и качества услуг в каждом отобранном муниципалитете. Была проведена оценка экономических и финансовых механизмов предоставления услуг в каждом определённом муниципалитете, разработан перечень инвестиций с матрицей приоритетов для каждого из муниципалитетов.

Проект также широко поддерживает государственно-частное сотрудничество. Для этих целей разработано Руководство и создан Комитет по оценке и отбору проектов.

22 августа 2022 года по программе ГЧС проведен отбор заявок двух проектов: компаний «Раян» и «Ноокат алмасы», по которым завершился тендер и идет подготовка для заключения договора с компанией по подготовке ПСД для проведения электричества и строительства дороги.

31 октября 2022 года были отобраны компании «Визит Алай», «Манас кызы Гульпери», «Памир экспедишн», по которым утверждаются ТЗ.

В настоящее время идет изучение еще нескольких заявок и подготовка необходимых документов.

Подкомпонент № 3.2.

На основе Стратегии предполагается развивать туристическую отрасль. Это такие направления деятельности, как туристический маркетинг, развитие туристических кластеров. В этом направлении будет проведена работа по реконструкции музейных комплексов г. Ош и Узген, в особенности Сулайман-Тоо и Узгенский минарет. Будут разработаны бренды этих музейных комплексов для привлечения местных и иностранных туристов. Также идет работа по разработке Стратегии и плана устойчивого развития туризма в Ошской области. Данная работа завершится в марте 2023 года. На основе Стратегии предполагается развивать туристическую отрасль. Это такие направления деятельности как туристический маркетинг, развитие туристических кластеров. В этом направлении будет проведена работа по реконструкции музейных комплексов г. Ош и Узген, в особенности Сулайман-Тоо и Узгенский минарет. Будут разработаны бренды этих музейных комплексов для привлечения местных и иностранных туристов. В рамках Проекта будет проведена работа по улучшению статистики туризма. В настоящее время идет процесс отбора консультанта по музейному делу и консультанта по Всемирному наследию.

Компонент 4:

В рамках данного направления планируется выдавать грантовые средства для развития малого и среднего бизнеса в размере 10 тыс. дол. США на первом этапе и успешные проекты могут участвовать на втором этапе, где могут получить до 20 тыс. долларов США. Для данного направления разработано и утверждено Руководство по малым грантам и создан Комитет при Министерстве экономики и коммерции КР. Планируется поддержать не менее 200 проектов на общую сумму 2,5 млн. дол. США. Эти мероприятия позволят создать новые рабочие места, а малый средний бизнес получит поддержку со стороны государства. Консультант разрабатывает сайт по программе малых грантов.

21 октября 2022 года был подписан контракт с консультационной компанией «Центр развития сельских муниципалитетов», которая подготовила План мероприятий и приступила к информационной компании в рамках рабочих поездок в Ошскую область. Также ведутся работы по разработке сайта по малым грантам совместно с сайтом по ГЧС.

Компонент 5:

В целях повышения потенциала по всем вышеперечисленным направлениям проводятся круглые столы, консультационные и рабочие встречи, семинары и тренинги. Так проведены семинары по цепочке добавленной стоимости и по государственно-частному партнерству в г. Ош и по районам Ошской области. По итогам проведенных мероприятий приняли участие 6915 участников. Эти мероприятия направлены для широкого информирования о проекте и предоставляемых возможностях для развития.

В рамках улучшения мониторинга мероприятий по проекту были подготовлены и предоставлены отчеты по проекту за 3 и 4й кварталы в программе MS-Project. По рекомендации Всемирного Банка была разработана анкета для бенефициаров с целью измерения степени удовлетворенности проектом, которая будет внедряться с 2023 года.

Первый пилотный опрос был проведен в рамках программы ГЧС среди бенефициаров проекта. Всего было опрошено 76 человек, из них 14 женщин.

Основные препятствия, возникшие в ходе реализации мероприятий

Задержка в тендерных процессах

Тендерные процессы затягиваются, в частности из-за недостаточного количества участников, изъявившее желание на участие в тендере, после чего приходилось объявлять ретендер. Время на тендер и ретендер составило около 6-8 месяцев.

Пути решения проблем:


В целях ускорения успешного проведения тендера были снижены некоторые требования к участникам.

Приложения

Таблица № 1. Количество участников по типам мероприятий

Направления	Компонент	Количество проведенных встреч	Общее количество участников	Из них сколько женщин
Программа Ошской области	1.1	11	180	42
Тренинг по пищевой безопасности	1.2	2	221	105
Тренинг по повышению потенциала	1.2	4	95	64
Тренинг по ЦДС и агрокластерам	2	4	85	33
Туризм	3.2	5	31	13
Стратегия туризма	3.2	49	247	59
Статистика туризма	3.2	4	25	19
ПСД	3.1	19	93	44
Встреча по разработке ТЭО для лабораторий (М-вектор)	1.2	21	106	33
Агролид (Инф.компания)	2	130	4958	679
ГЧС	3.1	8	424	49
Агровей	2	33	450	103
ИТОГО:		286	6915	1243

Обсуждения, встречи, обучения

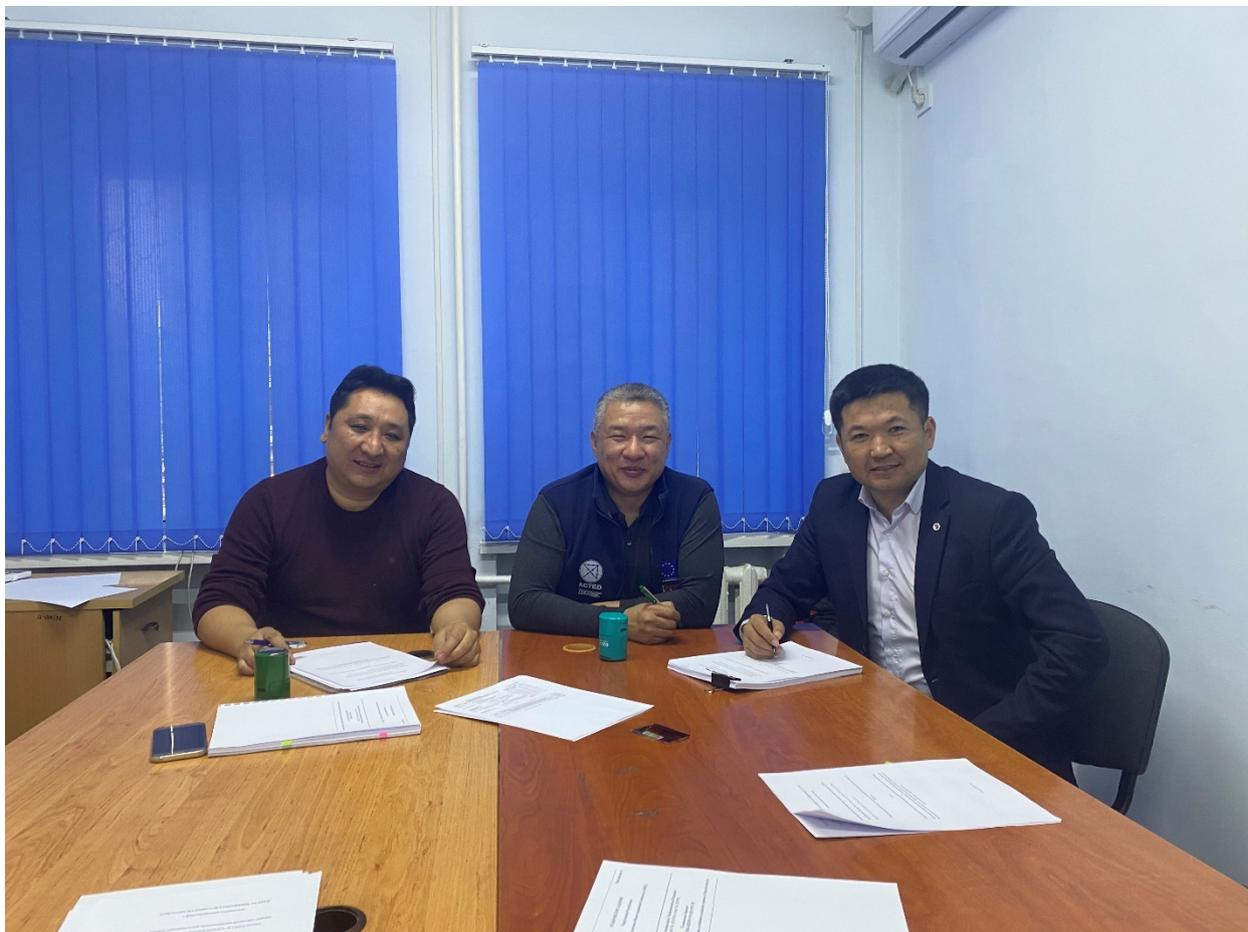





Статус мероприятий на конец 2022 года

Статус согласованных этапов:

#	Название мероприятия	Срок исполнения	Статус
Компонент 1.1 Улучшение регионального экономического планирования и регулятивных функций			
1	Цифровая он-лайн платформа	Пересмотренное ТЗ должно быть представлено АРИС после миссии в ноябре.	ТЗ на рассмотрении Минфина
2	Стратегия экономического развития	АРИС предоставит Банку окончательный проект второго отчета 20 октября 2022 года.	Второй отчет был отправлен согласно графику. Презентация Драфта Стратегии была представлена Банку 22 ноября 2022 г.
Компонент 1.2 Улучшение основных сельскохозяйственных услуг и регулятивных функций			
3	ТЭО для лабораторий	окончательная разработка технических спецификаций будет завершена к 30 ноября 2022 года.	ЦКА доработал и подготовил финальный отчет, инвестиционный план 30 ноября 2022 г.
4	Компонент 2. Укрепление агропродовольственных цепочек поставок товаров и мелкими сельскохозяйственными производителями (МСП)		
	Комитет по ПП	ЦКА представит отчет о дальнейших шагах 20 октября	ЦКА предоставил отчет, провел очередное заседание по ПП 11 ноября, где были утверждены бизнес-планы и были подготовлены подпроектные предложения
Компонент 3.1 Катализиация инвестиций в туризм и городское развитие			
	Улучшение берега реки Ак-бура в Оше	АРИС должен пересмотреть ISR и ESMP до 25 ноября 2022 года.	Команда АРИС доработало ISR и ESMP, получила одобрение Банка, запущены тендерные процессы
	Общий технадзор	АРИС проинформирует Банк о дальнейших действиях до 28 октября 2022 года.	Тендер проведен, в процессе оценки
	Комплекты Сулайман-Тоо и Узген а. Услуги по проектированию	АРИС планирует провести оценку и подписать контракт декабря 2022 года.	Тендер проведен, оценка завершена. Запрос компании о превышения бюджета рассматривается с Банком
	б. Планы управления	ARIS ожидает, что контракт будет подписан к 15 декабря.	Компания отобрана ООО «Центр продвижения и развития» (Кыргызстан) и «HDC International» LTD (Великобритания). Идет процесс сбора документов идет оценка фин. тех предложения
	с. Надзор за строительными работами.	заявки подали 7 компаний, 5 компаний, вошедших в шорт-лист, подали запрос предложений. АРИС предоставит список в Банк для информации до 20 октября 2022 года.	Идет оценка ВЗ

d. Консультанты ЮНЕСКО и Музейному делу	АРИС загрузит ТЗ в STEP до 25 октября 2022 года.	ТЗ было загружено в срок. Пришли комментарии с Банка, загрузили заново. Был проведен тендер. Процесс оценки
Подготовка ТЭО и ПСД по улучшению туристической инфраструктуры национальных парков	30 сентября 2022 г.	Тендер завершился 30 сентября. Контракт был подписан 26 декабря 2022 г.
План управления национальными парками	Тендер продолжается (объявлен 11 октября), крайний срок подачи ВЗ 31 декабря 2022 г.	7 компаний подали, идет оценка ВЗ
Государственно-частное сотрудничество (ГЧС):	Консультант завершил работу над веб-сайтом ГЧС. Ожидается, что веб-сайт будет запущен в пробном режиме на неделе 17 октября 2022 года. Действия: АРИС предоставит Банку ссылку на веб-сайт, как только он начнет функционировать.	Демо-версия сайта была продемонстрирована Банку 23 ноября. С учетом предложений со стороны Банка, сайт был доработан.
Стратегия туризма	АРИС до конца декабря 2022 года должен предоставить третий отчет по Стратегии.	2 отчета предоставлены в Банк. 23 ноября 2022 года была продемонстрирована презентация проделанной работы.
ТЗ по статистике	Эта деятельность отложена до итогов работы похожего проекта в Иссык-Кульской области, чтобы учесть пробелы	
Консультант по малым грантам	Ожидается подписание контракта 18 октября 2022 года	Контракт с консультационной компанией «Центр развития сельских муниципалитетов» был подписан 21 октября 2022 года. Консультант предоставил План работ и отчет
Анкета для бенефициаров	АРИС подготовит короткую анкету для оценки степени удовлетворенности проектом	Анкета была отправлена и одобрена в Банком, был проведен пилотный опрос

Информация по проекту
«Проект Регионального экономического развития» (ПРЭР)
(донор – Международная Ассоциация Развития (МАР), Всемирный Банк)

Донор	Международная Ассоциация Развития (МАР)
Номер кредита/гранта (по соглашению)	Кредит № 65580 KG, Грант № D5700
Номер ID	P167428
Сектор	Сельское хозяйство/туризм/социальная инфраструктура
Общая сумма финансирования	60 млн. долларов США
Сумма кредита	30 млн. долларов США
Сумма гранта	30 млн. долларов США
Сумма тех. помощи	Не предусмотрен
Вклад ПКР (софинансирование):	Не предусмотрен
Вклад сообществ:	Не предусмотрен
Условия кредита:	1,5625% основная сумма, подлежащая погашению. 15 апреля и 15 октября каждого года начиная с 15 апреля 2026 года и заканчивая 15 октября 2027 года, включительно.
Географический охват (области):	Ошская область и г. Ош
Дата проведения КорСовета по инвестиционной политике (№ протокола, дата)	-----
Дата проведения Совета Донора (дата)	23 марта 2020 г.
Дата переговоров (№ распоряжения, дата):	12 март 2020 г
Дата подписания (№ распоряжения, дата):	12 май 2020 г
Дата ратификации (№ закона, дата):	18-июля КР №77 2020 г
Дата вступления в силу проекта:	07 декабря 2020 г
Исполнительное агентство:	АРИС КР
Реализующее агентство:	АРИС КР (ПРЭР)
Начало реализации проекта:	Декабрь 2020
Дата закрытия проекта:	18 декабря 2026 г.
Дата закрытия финансирования проекта:	18 апреля 2027г

Продление по проекту (даты):	-----
Освоение средств по внешнему финансированию (нарастающим итогом с начала проекта включая отчетный период):	Грант № D5700: 1 800 006,09 доллар США Кредит № 6558 KG, – 0,0 тыс. \$ США
Освоение средств по внешнему финансированию за 2022 год:	План 2022 года 800,00 тыс. \$ США Освоение средств всего (Грант № D5700) - 800,01 тыс. \$ США
Освоение средств по внутреннему финансированию (нарастающим итогом с начала проекта включая отчетный период):	Не предусмотрен
Освоение средств по внутреннему финансированию за 2022 год:	Не предусмотрен
Вклад сообществ с нарастающим итогом с начала проекта, включая отчетный период:	Не предусмотрен
